LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT-BASED LEARNING (PBL)
MILESTONE 1

JADWALIN

KELOMPOK 2

3C · Semester 5

Tahun Akademik 2026/2027

No	Nama	NIM
1	M.Farras Awaluddin Alwi	244107060032
2	Muhammad Yusuf	244107060161
3	Neyza Ratu Anastasya	244107060119
4	Umi Maharani	244107060045

POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

2026

1. Peran Tim dan Dosen Pengampu

1.1 Peran dan Tanggung Jawab Anggota

Ditulis pada halaman tersendiri tepat setelah sampul. Cantumkan peran yang berlaku saat ini, tanggung jawab spesifik yang dapat ditelusuri ke WBS, dan perubahan dari proposal (beserta alasannya).

Nama	Peran	Tanggung Jawab Utama	Bagian Laporan yang Ditulis	Perubahan dari Proposal
M.Farras Awaluddin A	Project Manager	Memimpin koordinasi proyek dan sebagai Lead Backend Developer: repositori & Laravel, RBAC, migrasi 14 tabel, Model Eloquent, test suite, algoritma smart scheduling, shift swap, open shift, audit trail (PBL-1, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 29)	Mengkoordinasikan penyelesaian dokumen laporan secara keseluruhan dan menyusun *Use Case Diagram*	-
Muhammad Yusuf	Anggota	Database Designer & System Analyst: seeder data uji, CRUD departemen & posisi, pengaturan PP 35/2021, template shift, manajemen karyawan, dashboard operasional (PBL-9, 15, 18, 24, 25, 38)	Menyusun perancangan arsitektur basis data, *Entity Relationship Diagram* (ERD), dan menyusun alur proses sistem.	-

Nama	Peran	Tanggung Jawab Utama	Bagian Laporan yang Ditulis	Perubahan dari Proposal
Neyza Ratu Anastasya	Anggota	UI/UX Designer & Technical Writer: wireframe dan mockup Figma, landing page, form ketersediaan & auto-buffer, panel persetujuan, notifikasi in-app, laporan akhir (PBL-2, 7, 10, 19, 20, 26, 31)	Mengelola tata tulis dokumen secara keseluruhan, menyusun tata letak elemen *frontend*, dan penyusunan *Manual Book*.	-
Umi Maharani	Anggota	Full-Stack Developer & System Analyst: proposal, ERD relasional, base layout, presensi (clock-in/out, monitoring, auto clock-out), rekap timesheet, UAT (PBL-3, 6, 11, 13, 21, 27, 28, 30b)	Menyusun spesifikasi teknis dalam dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) dan *Activity Diagram*.	-

1.2 Dosen Pengampu

Mata Kuliah	Dosen Pengampu
Pemrograman Web Lanjut	Dian Hanifuddin Subhi, S.Kom, M.Kom
Penjamin Mutu	Usman Nurhasan, S.Kom., MT
Manajemen Proyek Sistem Informasi	Mahmud Yunus, S.Kom., M.Pd., MT.

2. Ringkasan Kemajuan

Status: On Track. Hingga Minggu 8, tim telah menuntaskan fase inisiasi dan setup (ERD 14 entitas, wireframe dan mockup, repositori Laravel, autentikasi multi-peran dan RBAC, migrasi 14 tabel, seeder, 50 skenario automated End-to-End (E2E) test berbasis Playwright pada modul utama) serta modul presensi clock-in/out, landing page, dan panel persetujuan ketersediaan. Menurut Jira per 14 Oktober 2026, 17 dari 36 tugas rinci selesai (66%). Yang tertinggal: finalisasi desain Figma menunggu penyesuaian palet warna baru, dokumen SKPL baru 80%, dan beberapa fitur Sprint 2 masih berjalan atau direview (smart scheduling builder, form ketersediaan & auto-buffer, rekap timesheet). Fitur Sprint 3 (shift swap, open shift, notifikasi, auto clock-out) belum dimulai, sesuai Gantt yang menjadwalkannya mulai 3 November 2026. Fokus berikutnya: menyelesaikan smart scheduling builder, template shift, pengaturan PP 35/2021, dan timesheet, kemudian memulai Sprint 3 dengan prioritas shift swap dan open shift berbasis pessimistic locking.

3. Rencana dan Realisasi

[Dokumen mata kuliah] Bila LTS Manajemen Proyek sudah memuat status dan jadwal, cukup rujuk (Lampiran D). Tabel 3.1 tetap ditulis.

3.1 Kemajuan Rincian Pekerjaan (WBS)

Persentase dihitung dari tugas rinci yang benar-benar selesai dan dapat dibuktikan.

Bagian Besar	Tugas Rinci	Penanggung Jawab	Status (Selesai/Berjalan/Belum)	Selesai (%)
Inisiasi, Analisis & Setup	PBL-1 Pembuatan ERD	Muhammad Farras A.A	Selesai	100
Inisiasi, Analisis & Setup	PBL-2 Drafting UI/UX & wireframe awal	Neyza Ratu Anastasya	Selesai	100
Inisiasi, Analisis & Setup	PBL-3 Finishing proposal & persetujuan dosen	Umi Maharani	Selesai	100
Inisiasi, Analisis & Setup	PBL-4 Inisialisasi repositori GitHub & Laravel	Muhammad Farras A.A	Selesai	100
Inisiasi, Analisis & Setup	PBL-5 Use case diagram & flowchart sistem	Muhammad Farras A.A	Selesai	100

Inisiasi, Analisis & Setup	PBL-6 Finalisasi ERD relasional (14 entitas)	Umi Maharani	Selesai	100
Inisiasi, Analisis & Setup	PBL-7 UI/UX halaman inti (mockup Figma mobile-first)	Neyza Ratu Anastasya	Selesai	100
Inisiasi, Analisis & Setup	PBL-12 Multi-role authentication & RBAC middleware	Muhammad Farras A.A	Selesai	100
Inisiasi, Analisis & Setup	PBL-13 Base layout responsif & brand design system	Umi Maharani	Selesai	100
Inisiasi, Analisis & Setup	PBL-14 Migrasi database (14 tabel)	Muhammad Farras A.A	Selesai	100
Inisiasi, Analisis & Setup	PBL-15 Seeder data uji multi-role	Muhammad Yusuf	Selesai	100
Inisiasi, Analisis & Setup	PBL-16 Automated E2E test suite berbasis Playwright (50 skenario uji E2E)	Muhammad Farras A.A	Selesai	100
Sprint 1: Fondasi Teknis, Master Data & Tampilan Publik	PBL-8 Model Eloquent & relasi database (14 entitas)	Muhammad Farras A.A	Selesai	100
Sprint 1: Fondasi Teknis, Master Data & Tampilan Publik	PBL-9 CRUD departemen & posisi jabatan	Muhammad Yusuf	Selesai	100

Sprint 1: Fondasi Teknis, Master Data & Tampilan Publik	PBL-26 Desain landing page publik & profil akun	Neyza Ratu Anastasya	Selesai	100
Sprint 1: Fondasi Teknis, Master Data & Tampilan Publik	PBL-11 Pencatatan kehadiran mandiri (clock-in/out)	Umi Maharani	Selesai	100
Sprint 1: Fondasi Teknis, Master Data & Tampilan Publik	PBL-39 Dokumen SKPL/SRS	Belum ditetapkan di Jira	Berjalan	80
Sprint 2: Ketersediaan, Template Shift & Core Scheduling	PBL-24 Pengaturan dinamis ketenagakerjaan (PP 35/2021)	Muhammad Yusuf	Sudah	100
Sprint 2: Ketersediaan, Template Shift & Core Scheduling	PBL-10 Form input jadwal halangan & auto-buffer	Neyza Ratu Anastasya	Sudah	100
Sprint 2: Ketersediaan, Template Shift & Core Scheduling	PBL-18 CRUD template shift rutin & kuota posisi	Muhammad Yusuf	Sudah	100
Sprint 2: Ketersediaan, Template Shift & Core Scheduling	PBL-19 Panel persetujuan ketersediaan (manajer)	Neyza Ratu Anastasya	Selesai	100
Sprint 2: Ketersediaan, Template Shift & Core Scheduling	PBL-17 Algoritma smart scheduling builder	Muhammad Farras A.A	Berjalan	90

Sprint 2: Ketersediaan, Template Shift & Core Scheduling	PBL-21 Rekap timesheet & ekspor Excel/PDF (tahap review)	Umi Maharani	Sudah	100
Sprint 2: Ketersediaan, Template Shift & Core Scheduling	PBL-21b Review kemajuan Sprint 2 & konsultasi dosen	Muhammad Farras A.A	Belum	0
Sprint 3: Shift Swap, Open Shift, Notifikasi & Otomatisasi	PBL-22 Dual-mode shift swap via atomic transaction	Muhammad Farras A.A	Belum	0
Sprint 3: Shift Swap, Open Shift, Notifikasi & Otomatisasi	PBL-25 Manajemen data karyawan per tim	Muhammad Yusuf	Belum	0
Sprint 3: Shift Swap, Open Shift, Notifikasi & Otomatisasi	PBL-27 Monitoring kehadiran real-time & toleransi terlambat	Umi Maharani	Belum	0
Sprint 3: Shift Swap, Open Shift, Notifikasi & Otomatisasi	PBL-20 Pusat notifikasi in-app	Neyza Ratu Anastasya	Belum	0
Sprint 3: Shift Swap, Open Shift, Notifikasi & Otomatisasi	PBL-23 Open shift broadcast & pessimistic locking	Muhammad Farras A.A	Belum	0
Sprint 3: Shift Swap, Open Shift, Notifikasi & Otomatisasi	PBL-38 Dashboard operasional berbasis role	Muhammad Yusuf	Belum	0
Sprint 3: Shift Swap, Open Shift,	PBL-28 Auto clock-out (cron job)	Umi Maharani	Belum	0

Notifikasi & Otomatisasi				
Sprint 4: QA, Uji Beban & Finalisasi	PBL-29 Audit trail log otomatis (event observer)	Muhammad Farras A.A	Belum	0
Sprint 4: QA, Uji Beban & Finalisasi	PBL-30 Uji beban & dokumen pengujian (test plan & report)	Muhammad Farras A.A	Belum	0
Sprint 4: QA, Uji Beban & Finalisasi	PBL-30b User acceptance testing dengan calon pengguna F&B	Umi Maharani	Belum	0
Sprint 4: QA, Uji Beban & Finalisasi	PBL-31 Laporan akhir PBL, user manual & poster	Neyza Ratu Anastasya	Belum	0
Sprint 4: QA, Uji Beban & Finalisasi	PBL-31b Finalisasi laporan akhir, video demo & gelar karya	Seluruh Tim	Belum	0

3.2 Jadwal Rencana dan Aktual

Jelaskan setiap deviasi beserta penyebabnya secara jujur.

Minggu	Rencana	Aktual	Deviasi dan Alasan
1-3	Pembentukan tim, Identifikasi masalah, dan Penyusunan rencana	Tim baru terbentuk pada minggu 3, identifikasi masalah dan penyusunan rencana dilakukan di minggu 3	Pada minggu 2 tidak ada pertemuan dengan dosen karena libur nasional
4	Review proposal produk	Draft proposal sudah dibuat dan dikumpulkan	Tidak ada deviasi. Sudah berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.

Minggu	Rencana	Aktual	Deviasi dan Alasan
5-7	Perancangan (SKPL, ERD, UI/UX) dan Pengembangan fitur inti (iterasi 1)	Perancangan ERD telah selesai sepenuhnya. Desain UI/UX sudah selesai, dan pengembangan fitur inti (iterasi 1) sudah dilakukan. Namun, finalisasi desain UI/UX di Figma masih tertunda karena ada penyesuaian	Terdapat sedikit deviasi pada finalisasi desain UI/UX. **Alasan:** Adanya keputusan perubahan palet warna yang digunakan pada website, sehingga desain UI/UX di Figma masih belum direvisi dan menunggu penyesuaian dengan warna yang baru
8	Demo progress tengah semester	Akan dilaksanakan minggu 8	Tidak ada deviasi. Sudah berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.

4. Capaian Produk

4.1 Status Fitur

Status: Selesai / Sebagian / Belum. Tandai fitur yang dapat didemonstrasikan pada Minggu 8.

Fitur	Status	Catatan
Modul pencatatan kehadiran (Clock in/Clock out)	Done	PBL-11, Umi Maharani; selesai 14 Okt 2026; dapat didemonstrasikan di Minggu 8
Landing page	Done	PBL-26, Neyza Ratu Anastasya; selesai 10 Okt 2026; dapat didemonstrasikan di Minggu 8
Panel persetujuan ketersediaan	Done	PBL-19, Neyza Ratu Anastasya; panel persetujuan untuk manajer
Smart scheduling builder	In progress	PBL-17, Muhammad Farras A.A; pseudo-code ada di SDD 4.1; target selesai menurut Gantt 28 Oktober 2026
Form Input Jadwal Halangan Karyawan & Auto-Buffer	In progress	PBL-10, Neyza Ratu Anastasya; validasi backend (jeda 30 menit) belum selesai; target 23 Okt 2026
Rekapitulasi Timesheet & Ekspor Excel/PDF	Review	PBL-21, Umi Maharani; target selesai 2 Nov 2026

Fitur	Status	Catatan
Template shift rutin	To Do	PBL-18, Muhammad Yusuf; target 25 Okt 2026
Pengaturan dinamis ketenagakerjaan	To Do	PBL-24, Muhammad Yusuf; parameter PP 35/2021 (40 jam/minggu, lembur maks. 4 jam/hari); target 19 Okt 2026
Pusat notifikasi in app karyawan	To Do	PBL-20, Neyza Ratu Anastasya; jadwal Sprint 3, 3-14 Nov 2026
Monitoring kehadiran real-time karyawan	To Do	PBL-27, Umi Maharani; jadwal Sprint 3, 3-14 Nov 2026
Otomatisasi penutupan absensi karyawan	To Do	PBL-28, Umi Maharani; cron job auto clock-out; jadwal 14-21 Nov 2026
Dual-Mode Shift Swap & Transfer (Handover & Mutual Barter) via Atomic Transaction	To Do	PBL-22, Muhammad Farras A.A; jadwal 3-12 Nov 2026
Open Shift Broadcast & Pessimistic Locking	To Do	PBL-23, Muhammad Farras A.A; jadwal 8-16 Nov 2026

4.2 Daftar Periksa Target Milestone 1

Centang target sesuai jalur tim, hapus jalur yang tidak berlaku, dan beri catatan singkat untuk target yang belum tercapai.

SIB Semester 5

- ✓ Arsitektur web berjalan (API dan autentikasi)
- ✓ Fitur multiperan mulai berfungsi
- ✓ Rencana pengujian awal tersusun
- ✓ Jadwal, risiko, dan perubahan terdokumentasi

Catatan untuk target yang belum tercapai:

Rencana pengujian formal (test plan dan test report) baru dijadwalkan pada PBL-30 (1-8 Desember 2026). Untuk saat ini Pengujian fungsional otomatis telah disusun menggunakan Playwright yang mencakup 50 skenario uji E2E untuk memvalidasi alur autentikasi, master data, ketersediaan, presensi, hingga scheduling builder di browser secara otomatis. yang sudah lulus (PBL-16), sehingga target ini ditandai belum tercapai penuh. Target lain terpenuhi: autentikasi multi-peran dan RBAC middleware (PBL-12) berjalan, dan jadwal (Gantt Jira), risiko, serta ruang lingkup terdokumentasi pada M05, M06a, dan M06b.

4.3 Status Rencana Pengujian [Sem 5]

Ruang lingkup QA plan mencakup pengujian fungsional per modul (autentikasi dan RBAC, master data, ketersediaan, presensi), pengujian konkurensi pada klaim open shift dan shift swap, uji beban, dan UAT dengan calon pengguna F&B. Status saat ini:

Aspek	Status
Automated test suite	50 kasus uji E2E antarmuka disusun menggunakan Playwright (PBL-16), mencakup pengujian positif, negatif, dan validasi RBAC lintas modul.
Test plan dan test report formal	Belum disusun; dijadwalkan PBL-30 (1-8 Des 2026)
Uji beban dan konkurensi (target 0 bentrok, 0 dobel klaim)	Belum dijalankan; menunggu fitur open shift dan shift swap (PBL-22, PBL-23)
UAT dengan calon pengguna F&B	Dijadwalkan PBL-30b (5-12 Des 2026)

4.4 Prototipe dan Antarmuka [SIB]

Wireframe awal (PBL-2) dan mockup Figma mobile-first untuk halaman inti (PBL-7) sudah selesai dan menjadi acuan implementasi. Antarmuka yang sudah diimplementasikan mengikuti mockup tersebut: base layout responsif dan brand design system (PBL-13), landing page publik dan profil akun (PBL-26), serta panel persetujuan ketersediaan untuk manajer (PBL-19). Form ketersediaan mengikuti masukan review mockup dengan staf part-time pada 28 September 2026, yaitu grid centang per hari yang ramah ponsel.

Perbedaan dengan prototipe: tim memutuskan mengganti palet warna website, sehingga implementasi memakai palet baru sementara desain di Figma belum direvisi. Revisi Figma akan menyusul agar prototipe dan antarmuka kembali selaras.

5. Bukti Kemajuan

Tautan harus dapat diklik dan terbuka tanpa login. Cantumkan juga di Lampiran E.

Jenis Bukti	Tautan/Keterangan
Repositori Git (riwayat commit seluruh anggota)	https://github.com/farras55/jadwalin
Video demonstrasi (maks. 3 menit)	[URL]
Aplikasi yang sudah di-deploy	[URL]
Tangkapan layar	Lampiran A

6. Kontribusi Individu

Catat pekerjaan tiap anggota sampai Minggu 8 beserta bukti yang dapat ditelusuri. Disepakati bersama oleh seluruh anggota.

Nama	Tugas Selesai	Bukti	Estimasi Kontribusi (%)
M. Farras Awaluddin Alwi	Implementasi Model Eloquent & Relasi Database, Implementasi Kode Algoritma Smart Scheduling Builder	Jira PBL-8 dan PBL-17; riwayat commit dan Pull Request di repositori GitHub	25%
Muhammad Yusuf	Modul CRUD Departemen & Posisi Jabatan	Jira PBL-9; riwayat commit dan Pull Request di GitHub	25%
Neyza Ratu Anastasya	Desain Landing Page Publik & Profil Akun, Panel Persetujuan Ketersediaan (Manager), Form Input Jadwal Halangan Karyawan & Auto-Buffer	Jira PBL-26, PBL-19, PBL-10; file Figma; riwayat commit di GitHub	25%
Umi Maharani	Modul Pencatatan Kehadiran Mandiri (Clock-In/Clock-Out), Rekapitulasi Timesheet & Ekspor Excel/PDF	Jira PBL-11 dan PBL-21; riwayat commit dan Pull Request di GitHub	25%

Seluruh pekerjaan sampai dengan Minggu 8 (Milestone 1) telah terdistribusi secara seimbang (masing-masing 25%) dengan fokus peran teknis yang saling melengkapi. Verifikasi bukti kontribusi didukung oleh rekam jejak Pull Request di GitHub, status tiket yang terselesaikan di Jira Board, serta otomatisasi pengujian E2E menggunakan Playwright untuk memvalidasi fitur yang telah dibangun oleh masing-masing anggota.

7. Kendala dan Solusi

[Dokumen mata kuliah] Bila kendala sudah diuraikan pada dokumen tambahan mata kuliah, cukup rujuk lalu tambahkan kendala khusus produk.

Kendala	Dampak	Solusi/Rencana	Bantuan yang Dibutuhkan
Tim baru terbentuk pada minggu 3 dan tidak ada pertemuan dosen di	Perencanaan awal baru dimulai di minggu 3	Penyusunan rencana dipadatkan; proposal dikumpulkan tepat waktu pada minggu 4	Tidak ada

minggu 2 (libur nasional)			
Kompleksitas algoritma deteksi bentrok staf lintas shift pada Smart Scheduling Builder	Riset logika memakan waktu 4 hari lebih lama; PBL-17 masih berjalan	Menyederhanakan penjadwalan menjadi dua tahap: pemfilteran ketersediaan, lalu alokasi staf berdasarkan kuota posisi	Review pseudo-code algoritma saat asistensi dosen
Perubahan palet warna website	Finalisasi desain Figma tertunda dan belum direvisi	Merevisi Figma sesuai palet baru dengan acuan brand design system (PBL-13)	Tidak ada
Koordinasi tim terganggu tugas kuliah lain (awal Minggu 6)	Ritme pengerjaan frontend dan backend sempat tidak sinkron	Standup 15 menit via Discord dan checklist pekerjaan di Jira Board	Tidak ada
Potensi race condition pada klaim open shift dan shift swap	Memerlukan mekanisme locking khusus di database; fitur belum diimplementasikan	Pessimistic locking (lockForUpdate) di dalam DB::transaction pada PBL-22 dan PBL-23, divalidasi lewat uji beban PBL-30	Review arsitektur concurrency (sudah dilakukan bersama asisten lab pada 8 Okt 2026)
Dokumen SKPL/SRS (PBL-39) baru 80% dan belum memiliki penanggung jawab di Jira	Dokumen kebutuhan belum final	Menetapkan penanggung jawab dan menyelesaikan SKPL	Tidak ada

8. Perubahan Lingkup dan Risiko

8.1 Perubahan dari Proposal

Sebutkan perubahan judul, fitur, teknologi, atau peran, alasannya, dan apakah sudah dikonsultasikan dengan dosen pengampu. Tulis "Tidak ada perubahan" bila tidak ada.

Selama pelaksanaan Milestone 1, terdapat beberapa penyesuaian dari rencana awal terutama pada aspek UI/UX dan urutan/prioritas pengerjaan fitur. Perubahan UI/UX terjadi pada palette warna yang perlu disesuaikan kembali, sedangkan beberapa fitur Sprint 2 masih dalam tahap pengembangan dan review, sehingga penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan kondisi implementasi. Penyesuaian tersebut tidak mengubah tujuan utama maupun ruang

lingkup tingkat tinggi proyek JADWALIN. Penyesuaian tersebut telah dikonsultasikan dengan dosen pengampu.

8.2 Risiko Utama

Maksimal 5 risiko terbesar untuk iterasi berikutnya. Risiko yang sudah ada di dokumen mata kuliah boleh dirujuk.

Risiko	Tingkat (Tinggi/ Sedang/ Rendah)	Tindakan Pencegahan
Risiko race condition pada fitur Open Shift dan Shift Swap	Tinggi	Melakukan perancangan dan pengujian mekanisme concurrency agar proses klaim dan pertukaran shift tidak menimbulkan konflik data.
Beban Sprint 3 terlalu padat sementara beberapa tugas Sprint 2 belum selesai	Tinggi	Menyelesaikan tugas Sprint 2 yang masih berjalan terlebih dahulu dan menentukan prioritas pengerjaan fitur Sprint 3.
Smart Scheduling Builder terlambat karena kompleksitas pengembangan	Sedang	Mengembangkan fitur secara bertahap dan menyederhanakan proses penjadwalan sesuai kebutuhan sistem.
SKPL/SRS masih 80% dan Figma belum selaras dengan palet baru	Sedang	Menyelesaikan dokumentasi SKPL/SRS dan melakukan penyesuaian Figma terhadap palet desain yang telah ditentukan.
Pengujian formal belum tersusun dan UAT belum terlaksana	Sedang	Menyusun rencana pengujian dan mempersiapkan pelaksanaan UAT pada tahap pengembangan berikutnya.

9. Rencana Menuju Milestone 2 (Minggu 9–12)

Target produk fungsional lengkap dan hasil uji awal; harus layak berdasarkan kemajuan sebenarnya pada Bagian 3.

Minggu	Target	Penanggung Jawab
9	Pengembangan lanjut, Integrasi dan Mulai pengujian fungsionalitas sistem	Seluruh Tim
10	Pengembangan lanjut, Integrasi dan Mulai pengujian fungsionalitas sistem	Seluruh Tim
11	Pengembangan lanjut, Integrasi dan Mulai pengujian fungsionalitas sistem	Seluruh Tim
12	Demo produk fungsional + hasil uji	Seluruh Tim

10. Rekap Logbook Minggu 1–8

Logbook lengkap dilampirkan pada Lampiran B.

Minggu	Pekerjaan Selesai	Kendala	Rencana Berikutnya
1	Pembentukan awal dan persiapan proyek.	Belum terdapat rincian kendala khusus pada ringkasan logbook yang tersedia.	Melanjutkan persiapan proyek dan menyepakati arah serta kebutuhan awal pengembangan.
2	Persiapan awal proyek dan koordinasi tim.	Koordinasi perlu dijaga agar pembagian pekerjaan dan komunikasi antaranggota berjalan selaras.	Memperjelas pembagian peran, tanggung jawab, dan rencana kerja tim.
3	Pembentukan tim dan pembagian peran/tanggung jawab proyek.	Rincian kendala khusus minggu ini belum dijelaskan dalam ringkasan logbook.	Melanjutkan perencanaan proyek dan memastikan setiap anggota memahami tugasnya.
4	Review proposal dan penyempurnaan rencana proyek.	Rencana proyek masih perlu diselaraskan dengan kebutuhan dan tahapan pengembangan sistem.	Melanjutkan perancangan sistem dan mempersiapkan kebutuhan pengembangan awal.
5	Pengerjaan UI/UX, wireframe, mockup, dan pengembangan awal sistem.	Desain antarmuka masih perlu disesuaikan dengan perubahan palet warna agar konsisten dengan implementasi.	Melanjutkan pengembangan sistem serta menyelaraskan desain dengan tampilan aplikasi.
6	Pengembangan dan implementasi fitur sistem dilanjutkan.	Sempat terjadi ketidaksinkronan koordinasi antara pekerjaan frontend dan backend.	Meningkatkan koordinasi tim melalui komunikasi rutin dan checklist tugas di Jira.
7	Pengembangan fitur dan implementasi sistem dilanjutkan.	Kompleksitas algoritma penjadwalan, terutama pendeteksian bentrok jadwal, menjadi tantangan pengembangan.	Menyederhanakan tahapan algoritma penjadwalan dan melanjutkan penyelesaian fitur prioritas.

Minggu	Pekerjaan Selesai	Kendala	Rencana Berikutnya
8	Demo perkembangan proyek dan evaluasi progres Milestone 1.	Beberapa pekerjaan masih berjalan, termasuk penyempurnaan dokumentasi, desain, dan fitur lanjutan.	Melanjutkan Smart Scheduling Builder, template shift, timesheet, serta persiapan fitur pertukaran shift dan Open Shift.

11. Deklarasi Penggunaan AI

Sebutkan bagian yang dibantu AI, alat yang digunakan, dan tujuannya. Seluruh anggota harus memahami dan mampu menjelaskan hasilnya. Tulis "Tidak menggunakan AI" bila memang tidak ada.

Bagian	Alat	Tujuan
Penyusunan Dokumen	Claude, Gemini	Membantu dalam penyempurnaan tata bahasa, pemilihan diksi yang lebih formal, dan merapikan struktur penulisan dokumen laporan.
Pembuatan Web	Antigravity IDE	Membantu memberikan saran penulisan kode (sintaks), mencari referensi pemecahan masalah (*debugging*), dan mempercepat pengembangan fitur pada sistem.


12. Lampiran

Lampiran disusun dengan urutan sebagai berikut:


- Lampiran A: Tangkapan layar fitur
- Lampiran B: Logbook lengkap Minggu 1–8
- Lampiran C: Dokumen pendukung (opsional)
- Lampiran D: Dokumen tambahan mata kuliah (bila ada)
- Lampiran E: Daftar tautan eksternal


Lampiran A. Tangkapan Layar

1.Halaman Login

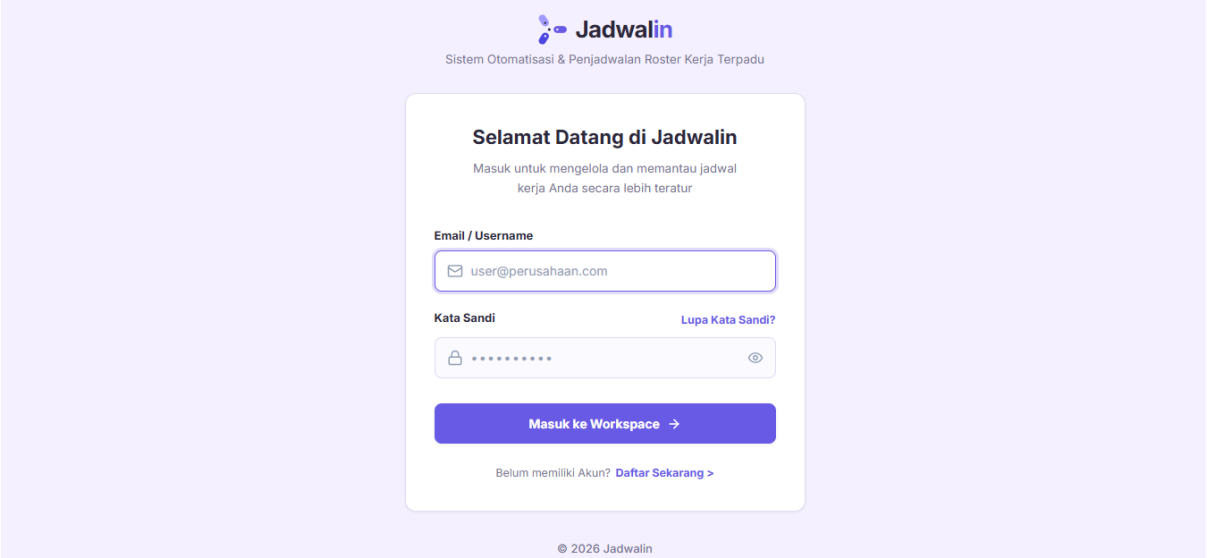



2.Dashboard

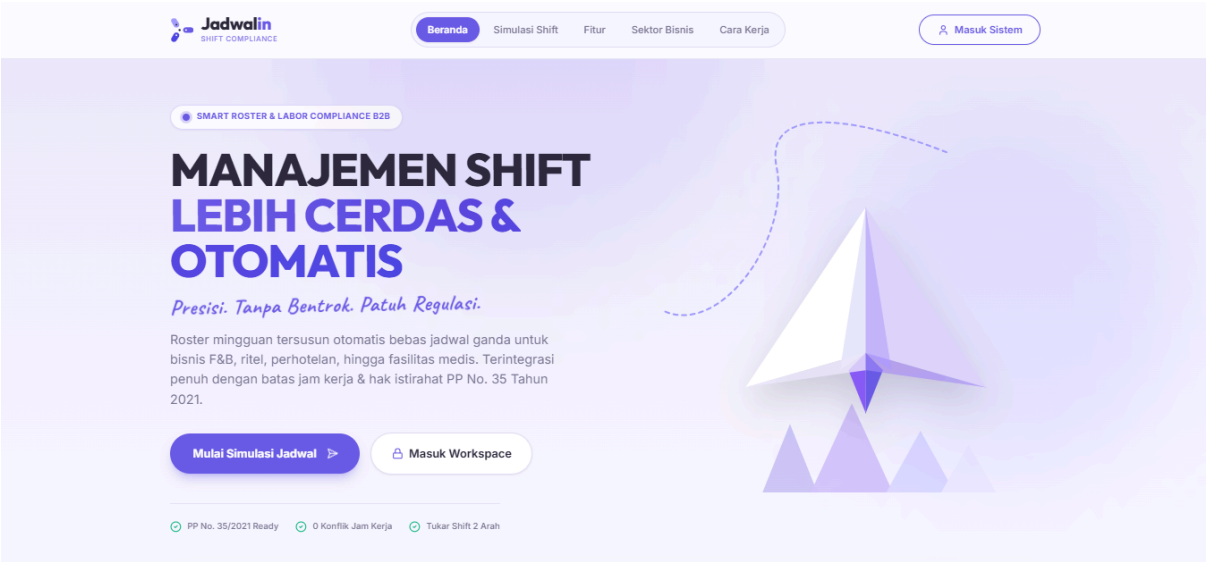


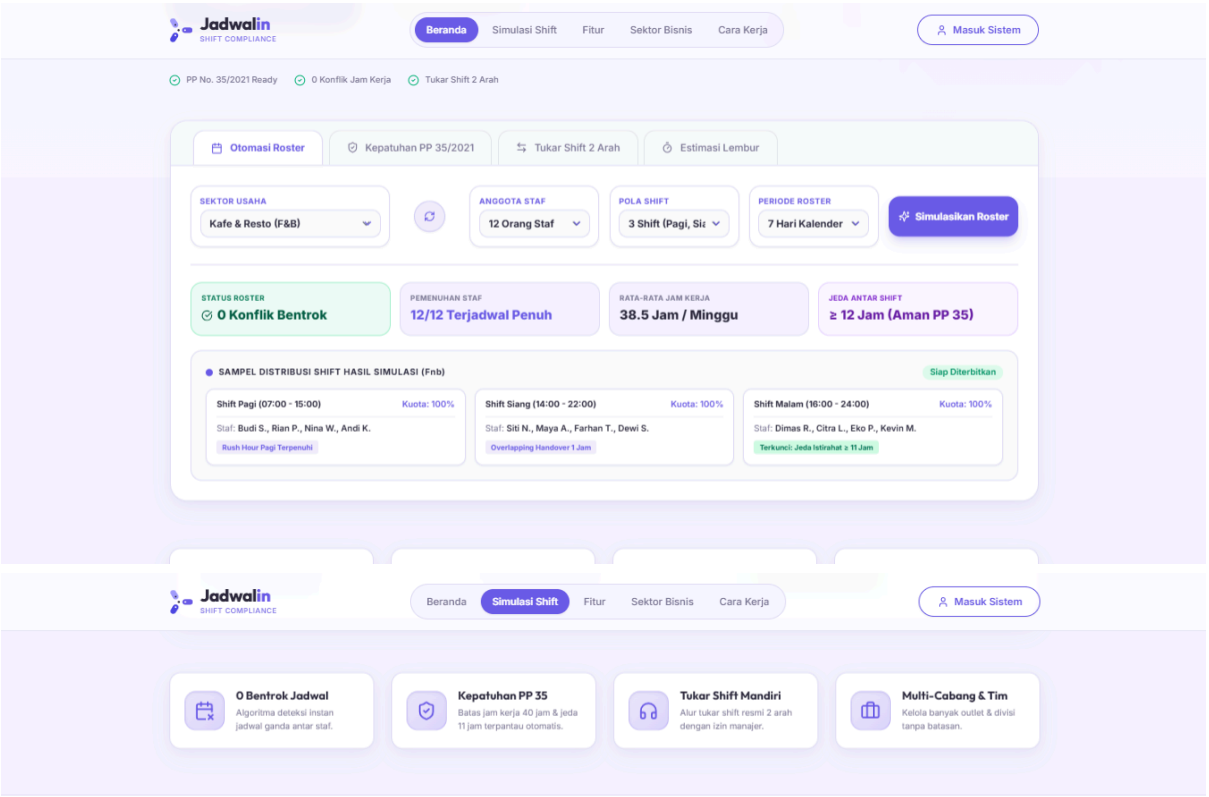

Jadwalin
SHIFT COMPLIANCE
Beranda
Simulasi Shift
Fitur
Sektor Bisnis
Cara Kerja
Masuk Sistem
PP No. 35/2021 Ready
0 Konflik Jam Kerja
Tukar Shift 2 Arah
Otomasi Roster
Kepatuhan PP 35/2021
Tukar Shift 2 Arah
Estimasi Lembur
SEKTOR USAHA
Kafe & Resto (F&B)
ANGGOTA STAF
12 Orang Staf
POLA SHIFT
3 Shift (Pagi, Si
PERIODE ROSTER
7 Hari Kalender
Simulasikan Roster
STATUS ROSTER
0 Konflik Bentrok
PEMENUHAN STAF
12/12 Terjadwal Penuh
RATA-RATA JAM KERJA
38.5 Jam / Minggu
JEDA ANTAR SHIFT
≥ 12 Jam (Aman PP 35)
SAMPEL DISTRIBUSI SHIFT HASIL SIMULASI (Fnb)
Siap Diterbitkan
Shift Pagi (07:00 - 15:00)
Kuota: 100%
Staf: Budi S., Rian P., Nina W., Andi K.
Rush Hour Pagi Terpenuhi
Shift Siang (14:00 - 22:00)
Kuota: 100%
Staf: Siti N., Maya A., Farhan T., Dewi S.
Overlapping Handover 1 Jam
Shift Malam (16:00 - 24:00)
Kuota: 100%
Staf: Dimas R., Citra L., Eko P., Kevin M.
Terkunci: Jeda Istirahat ≥ 11 Jam


Jadwalin
SHIFT COMPLIANCE
Beranda
Simulasi Shift
Fitur
Sektor Bisnis
Cara Kerja
Masuk Sistem
0 Bentrok Jadwal
Algoritma deteksi instan jadwal ganda antar staf.
Kepatuhan PP 35
Batas jam kerja 40 jam & jeda 11 jam terpantau otomatis.
Tukar Shift Mandiri
Alur tukar shift resmi 2 arah dengan izin manajer.
Multi-Cabang & Tim
Kelola banyak outlet & divisi tanpa batasan.

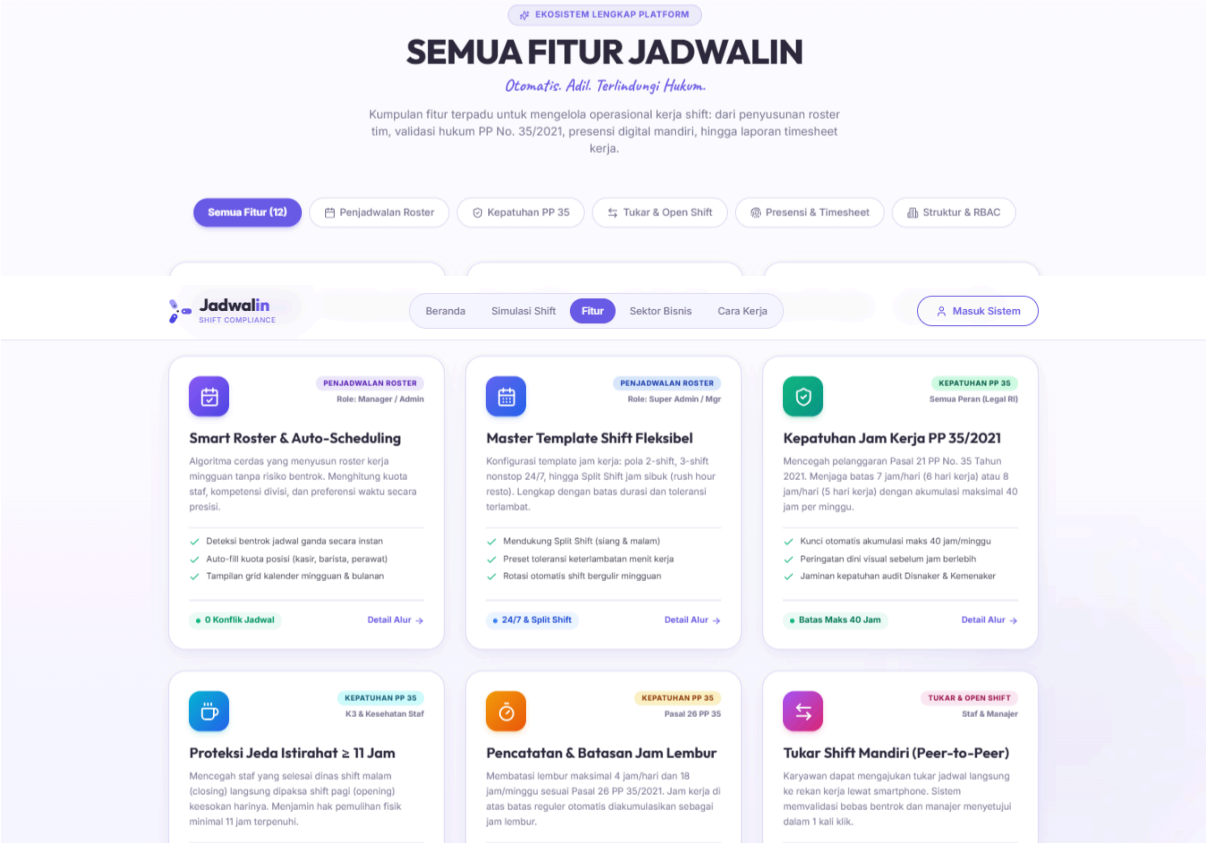
EKOSISTEM LENGKAP PLATFORM
SEMUA FITUR JADWALIN
Otomatis. Adil. Terlindungi Hukum.
Kumpulan fitur terpadu untuk mengelola operasional kerja shift: dari penyusunan roster tim, validasi hukum PP No. 35/2021, presensi digital mandiri, hingga laporan timesheet kerja.
Semua Fitur (12)
Penjadwalan Roster
Kepatuhan PP 35
Tukar & Open Shift
Presensi & Timesheet
Struktur & RBAC
Jadwalin
SHIFT COMPLIANCE
Beranda
Simulasi Shift
Fitur
Sektor Bisnis
Cara Kerja
Masuk Sistem
PENJADWALAN ROSTER
Role: Manager / Admin
Smart Roster & Auto-Scheduling
Algoritma cerdas yang menyusun roster kerja mingguan tanpa risiko bentrok. Menghitung kuota staf, kompetensi divisi, dan preferensi waktu secara presisi.
Deteksi bentrok jadwal ganda secara instan
Auto-fill kuota posisi (kasir, barista, perawat)
Tampilan grid kalender mingguan & bulanan
0 Konflik Jadwal
Detail Alur
PENJADWALAN ROSTER
Role: Super Admin / Mgr
Master Template Shift Fleksibel
Konfigurasi template jam kerja: pola 2-shift, 3-shift nonstop 24/7, hingga Split Shift jam sibuk (rush hour resto). Lengkap dengan batas durasi dan toleransi terlambat.
Mendukung Split Shift (siang & malam)
Preset toleransi keterlambatan menit kerja
Rotasi otomatis shift bergulir mingguan
24/7 & Split Shift
Detail Alur
KEPATUHAN PP 35
Semua Peran (Legal RI)
Kepatuhan Jam Kerja PP 35/2021
Mencegah pelanggaran Pasal 21 PP No. 35 Tahun 2021. Menjaga batas 7 jam/hari (6 hari kerja) atau 8 jam/hari (5 hari kerja) dengan akumulasi maksimal 40 jam per minggu.
Kunci otomatis akumulasi maks 40 jam/minggu
Peringatan dini visual sebelum jam berlebih
Jaminan kepatuhan audit Disnaker & Kemenaker
Batas Maks 40 Jam
Detail Alur
KEPATUHAN PP 35
K3 & Kesehatan Staf
Proteksi Jeda Istirahat ≥ 11 Jam
Mencegah staf yang selesai dinas shift malam (closing) langsung dipaksa shift pagi (opening) keesokan harinya. Menjamin hak pemulihan fisik minimal 11 jam terpenuhi.
KEPATUHAN PP 35
Pasal 26 PP 35
Pencatatan & Batasan Jam Lembur
Membatasi lembur maksimal 4 jam/hari dan 18 jam/minggu sesuai Pasal 26 PP 35/2021. Jam kerja di atas batas reguler otomatis diakumulasikan sebagai jam lembur.
TUKAR & OPEN SHIFT
Staf & Manajer
Tukar Shift Mandiri (Peer-to-Peer)
Karyawan dapat mengajukan tukar jadwal langsung ke rekan kerja lewat smartphone. Sistem memvalidasi bebas bentrok dan manajer menyetujui dalam 1 kali klik.

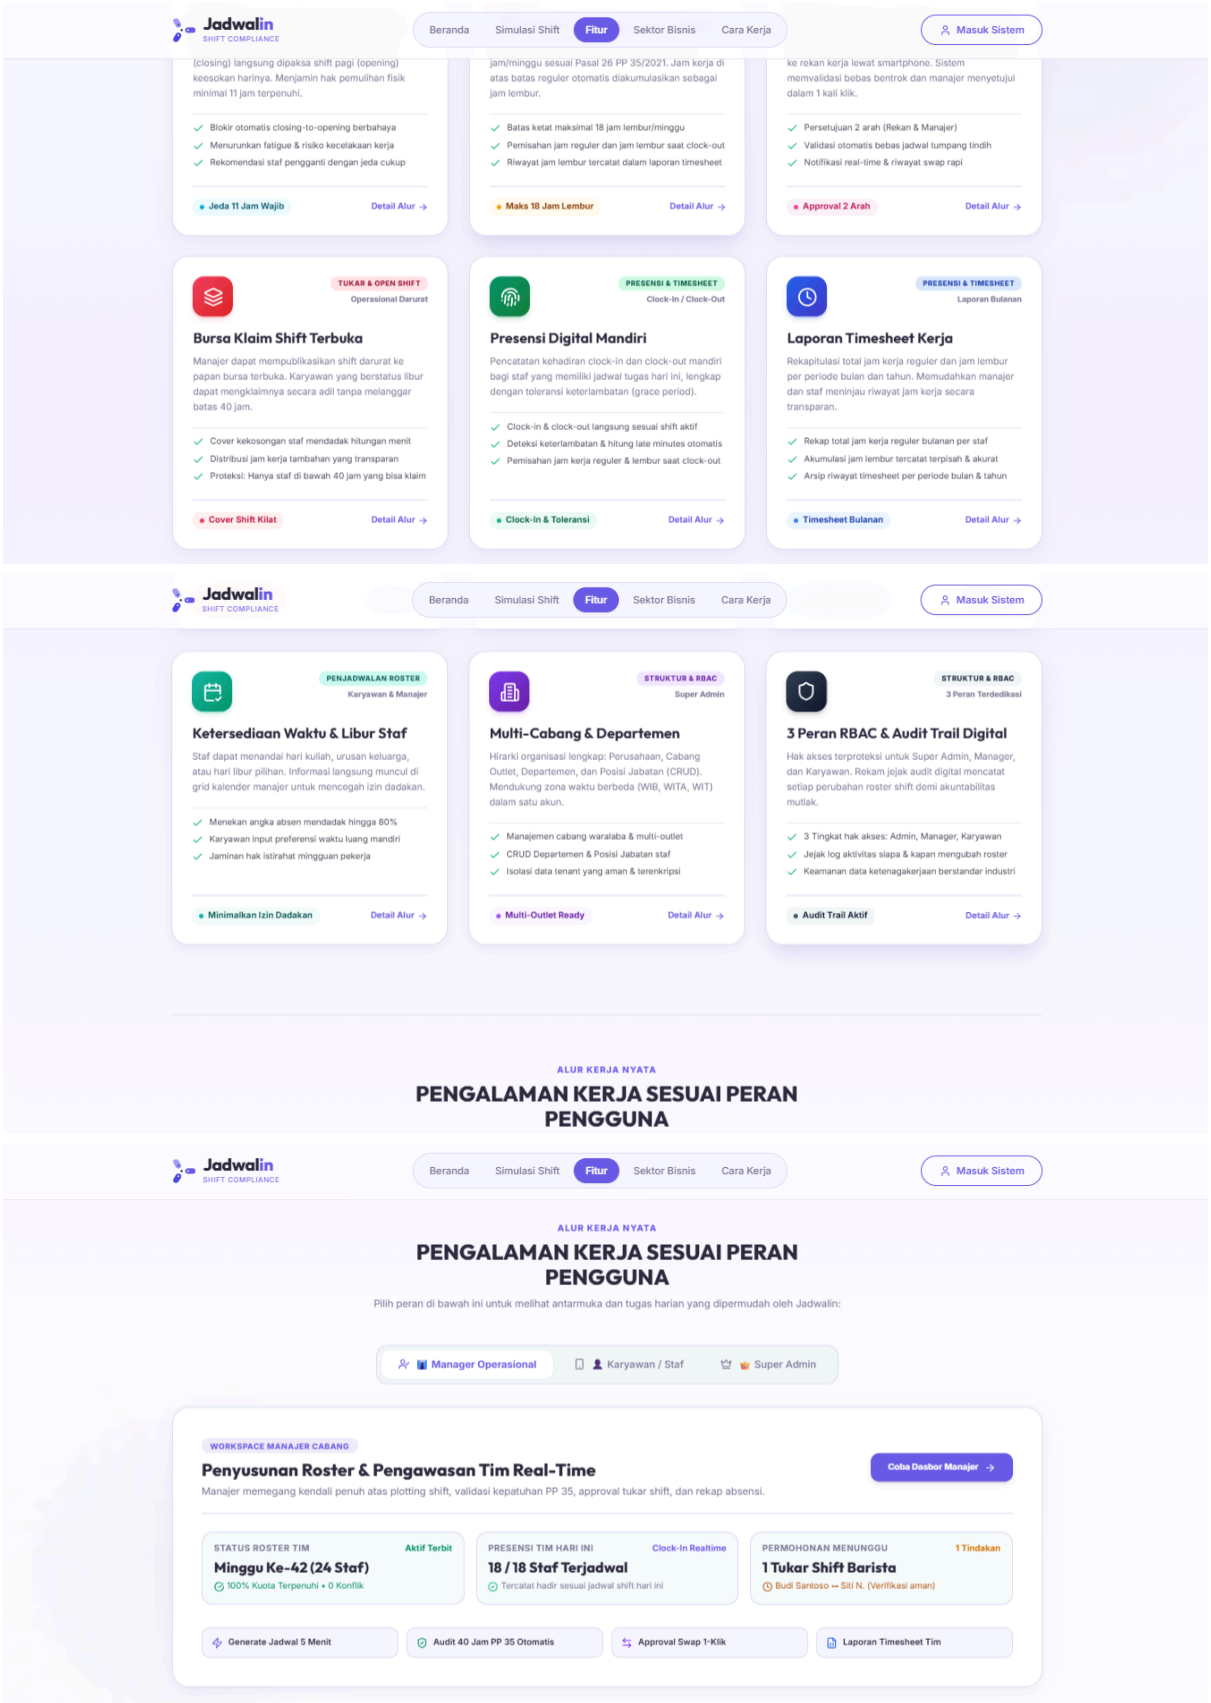

Jadwalin
SHIFT COMPLIANCE
Beranda
Simulasi Shift
Fitur
Sektor Bisnis
Cara Kerja
Masuk Sistem
(closing) langsung dipaksa shift pagi (opening) keesokan harinya. Menjamin hak pemulihan fisik minimal 11 jam terpenuhi.
Blokir otomatis closing-to-opening berbahaya
Menurunkan fatigue & risiko kecelakaan kerja
Rekomendasi staf pengganti dengan jeda cukup
Jeda 11 Jam Wajib
Detail Alur
jam/minggu sesuai Pasal 26 PP 35/2021. Jam kerja di atas batas reguler otomatis diakumulasikan sebagai jam lembur.
Batas ketat maksimal 18 jam lembur/minggu
Pemisahan jam reguler dan jam lembur saat clock-out
Riwayat jam lembur tercatat dalam laporan timesheet
Maks 18 Jam Lembur
Detail Alur
ke rekan kerja lewat smartphone. Sistem memvalidasi bebas bentrok dan manajer menyetujui dalam 1 kali klik.
Persetujuan 2 arah (Rekan & Manajer)
Validasi otomatis bebas jadwal tumpang tindih
Notifikasi real-time & riwayat swap rapi
Approval 2 Arah
Detail Alur
TUKAR & OPEN SHIFT
Operasional Darurat
Bursa Klaim Shift Terbuka
Manajer dapat mempublikasikan shift darurat ke papan bursa terbuka. Karyawan yang berstatus libur dapat mengklaimnya secara adil tanpa melanggar batas 40 jam.
Cover kekosongan staf mendadak hitungan menit
Distribusi jam kerja tambahan yang transparan
Proteksi: Hanya staf di bawah 40 jam yang bisa klaim
Cover Shift Kilat
Detail Alur
PRESENSI & TIMESHEET
Clock-In / Clock-Out
Presensi Digital Mandiri
Pencatatan kehadiran clock-in dan clock-out mandiri bagi staf yang memiliki jadwal tugas hari ini, lengkap dengan toleransi keterlambatan (grace period).
Clock-in & clock-out langsung sesuai shift aktif
Deteksi keterlambatan & hitung late minutes otomatis
Pemisahan jam kerja reguler & lembur saat clock-out
Clock-In & Toleransi
Detail Alur
PRESENSI & TIMESHEET
Laporan Bulanan
Laporan Timesheet Kerja
Rekapitulasi total jam kerja reguler dan jam lembur per periode bulan dan tahun. Memudahkan manajer dan staf meninjau riwayat jam kerja secara transparan.
Rekap total jam kerja reguler bulanan per staf
Akumulasi jam lembur tercatat terpisah & akurat
Arsip riwayat timesheet per periode bulan & tahun
Timesheet Bulanan
Detail Alur
Jadwalin
SHIFT COMPLIANCE
Beranda
Simulasi Shift
Fitur
Sektor Bisnis
Cara Kerja
Masuk Sistem
PENJADWALAN ROSTER
Karyawan & Manajer
Ketersediaan Waktu & Libur Staf
Staf dapat menandai hari kuliah, urusan keluarga, atau hari libur pilihan. Informasi langsung muncul di grid kalender manajer untuk mencegah izin dadakan.
Menekan angka absen mendadak hingga 80%
Karyawan input preferensi waktu luang mandiri
Jaminan hak istirahat mingguan pekerja
Minimalkan Izin Dadakan
Detail Alur
STRUKTUR & RBAC
Super Admin
Multi-Cabang & Departemen
Hirarki organisasi lengkap: Perusahaan, Cabang Outlet, Departemen, dan Posisi Jabatan (CRUD). Mendukung zona waktu berbeda (WIB, WITA, WIT) dalam satu akun.
Manajemen cabang waralaba & multi-outlet
CRUD Departemen & Posisi Jabatan staf
Isolasi data tenant yang aman & terenkripsi
Multi-Outlet Ready
Detail Alur
STRUKTUR & RBAC
3 Peran Terdedikasi
3 Peran RBAC & Audit Trail Digital
Hak akses terproteksi untuk Super Admin, Manager, dan Karyawan. Rekam jejak audit digital mencatat setiap perubahan roster shift demi akuntabilitas mutlak.
3 Tingkat hak akses: Admin, Manager, Karyawan
Jejak log aktivitas siapa & kapan mengubah roster
Keamanan data ketenagakerjaan berstandar industri
Audit Trail Aktif
Detail Alur
ALUR KERJA NYATA
PENGALAMAN KERJA SESUAI PERAN PENGGUNA
Jadwalin
SHIFT COMPLIANCE
Beranda
Simulasi Shift
Fitur
Sektor Bisnis
Cara Kerja
Masuk Sistem
ALUR KERJA NYATA
PENGALAMAN KERJA SESUAI PERAN PENGGUNA
Pilih peran di bawah ini untuk melihat antarmuka dan tugas harian yang dipermudah oleh Jadwalin:
Manager Operasional
Karyawan / Staf
Super Admin
WORKSPACE MANAJER CABANG
Penyusunan Roster & Pengawasan Tim Real-Time
Manajer memegang kendali penuh atas plotting shift, validasi kepatuhan PP 35, approval tukar shift, dan rekap absensi.
Coba Dasbor Manajer
STATUS ROSTER TIM
Aktif Terbit
Minggu Ke-42 (24 Staf)
100% Kuota Terpenuhi • 0 Konflik
PRESENSI TIM HARI INI
Clock-In Realtime
18 / 18 Staf Terjadwal
Tercatat hadir sesuai jadwal shift hari ini
PERMOHONAN MENUNGGU
1 Tindakan
1 Tukar Shift Barista
Budi Santoso ↔ Siti N. (Verifikasi aman)
Generate Jadwal 5 Menit
Audit 40 Jam PP 35 Otomatis
Approval Swap 1-Klik
Laporan Timesheet Tim

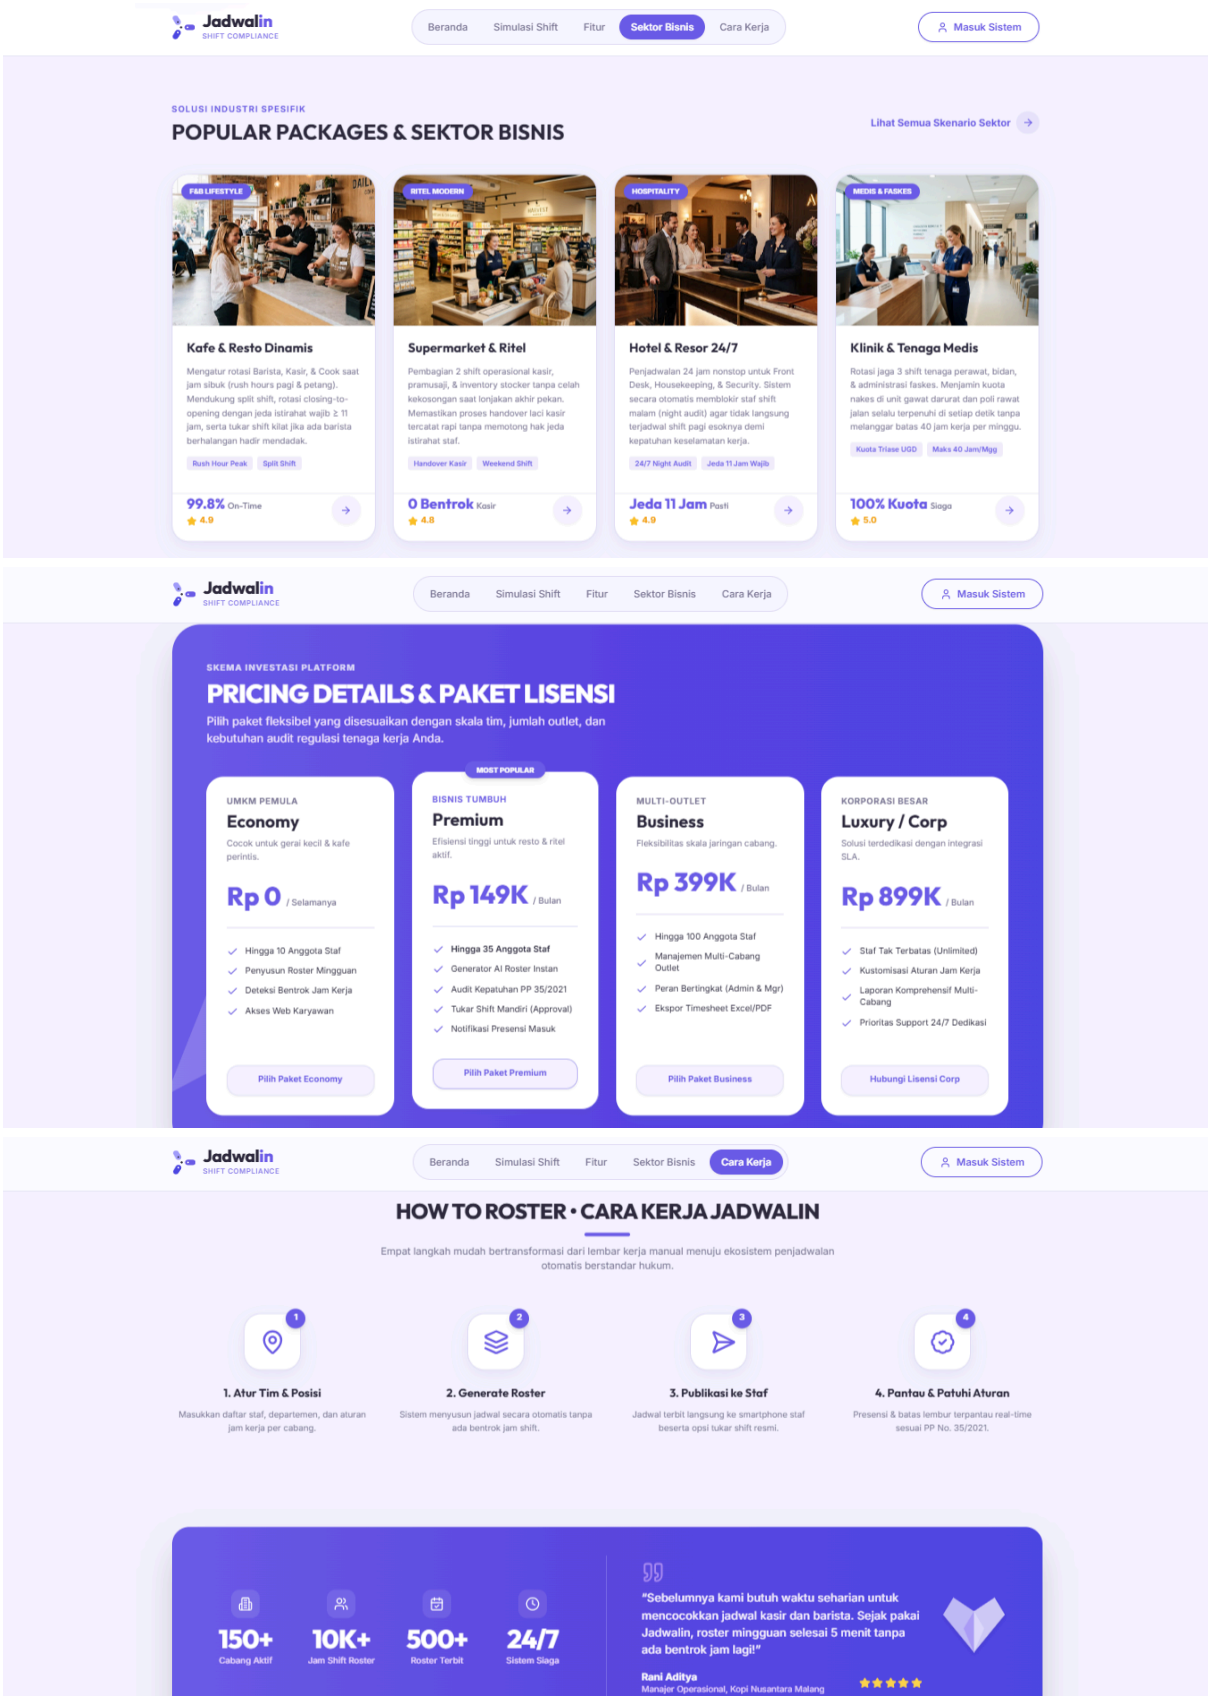

Jadwalin
SHIFT COMPLIANCE
Beranda
Simulasi Shift
Fitur
Sektor Bisnis
Cara Kerja
Masuk Sistem
SOLUSI INDUSTRI SPESIFIK
POPULAR PACKAGES & SEKTOR BISNIS
Lihat Semua Skenario Sektor
F&B LIFESTYLE
Kafe & Resto Dinamis
Mengatur rotasi Barista, Kasir, & Cook saat jam sibuk (rush hours pagi & petang). Mendukung split shift, rotasi closing-to-opening dengan jeda istirahat wajib ≥ 11 jam, serta tukar shift kilat jika ada barista berhalangan hadir mendadak.
Rush Hour Peak
Split Shift
99.8% On-Time
4.9
RITEL MODERN
Supermarket & Ritel
Pembagian 2 shift operasional kasir, pramusaji, & inventory stocker tanpa celah kekosongan saat lonjakan akhir pekan. Memastikan proses handover laci kasir tercatat rapi tanpa memotong hak jeda istirahat staf.
Handover Kasir
Weekend Shift
0 Bentrok Kasir
4.8
HOSPITALITY
Hotel & Resor 24/7
Penjadwalan 24 jam nonstop untuk Front Desk, Housekeeping, & Security. Sistem secara otomatis memblokir staf shift malam (night audit) agar tidak langsung terjadwal shift pagi esoknya demi kepatuhan keselamatan kerja.
24/7 Night Audit
Jeda 11 Jam Wajib
Jeda 11 Jam Posti
4.9
MEDIS & FASKES
Klinik & Tenaga Medis
Rotasi jaga 3 shift tenaga perawat, bidan, & administrasi faskes. Menjamin kuota nakes di unit gawat darurat dan poli rawat jalan selalu terpenuhi di setiap detik tanpa melanggar batas 40 jam kerja per minggu.
Kuota Triase UGD
Maks 40 Jam/Mgg
100% Kuota Siaga
5.0
Jadwalin
SHIFT COMPLIANCE
Beranda
Simulasi Shift
Fitur
Sektor Bisnis
Cara Kerja
Masuk Sistem
SKEMA INVESTASI PLATFORM
PRICING DETAILS & PAKET LISENSI
Pilih paket fleksibel yang disesuaikan dengan skala tim, jumlah outlet, dan kebutuhan audit regulasi tenaga kerja Anda.
UMKM PEMULA
Economy
Cocok untuk gerai kecil & kafe perintis.
Rp 0 / Selamanya
Hingga 10 Anggota Staf
Penyusun Roster Mingguan
Deteksi Bentrok Jam Kerja
Akses Web Karyawan
Pilih Paket Economy
MOST POPULAR
BISNIS TUMBUH
Premium
Efisiensi tinggi untuk resto & ritel aktif.
Rp 149K / Bulan
Hingga 35 Anggota Staf
Generator AI Roster Instan
Audit Kepatuhan PP 35/2021
Tukar Shift Mandiri (Approval)
Notifikasi Presensi Masuk
Pilih Paket Premium
MULTI-OUTLET
Business
Fleksibilitas skala jaringan cabang.
Rp 399K / Bulan
Hingga 100 Anggota Staf
Manajemen Multi-Cabang Outlet
Peran Bertingkat (Admin & Mgr)
Ekspor Timesheet Excel/PDF
Pilih Paket Business
KORPORASI BESAR
Luxury / Corp
Solusi terdedikasi dengan integrasi SLA.
Rp 899K / Bulan
Staf Tak Terbatas (Unlimited)
Kustomisasi Aturan Jam Kerja
Laporan Komprehensif Multi-Cabang
Prioritas Support 24/7 Dedikasi
Hubungi Lisensi Corp
Jadwalin
SHIFT COMPLIANCE
Beranda
Simulasi Shift
Fitur
Sektor Bisnis
Cara Kerja
Masuk Sistem
HOW TO ROSTER • CARA KERJA JADWALIN
Empat langkah mudah bertransformasi dari lembar kerja manual menuju ekosistem penjadwalan otomatis berstandar hukum.
1
1. Atur Tim & Posisi
Masukkan daftar staf, departemen, dan aturan jam kerja per cabang.
2
2. Generate Roster
Sistem menyusun jadwal secara otomatis tanpa ada bentrok jam shift.
3
3. Publikasi ke Staf
Jadwal terbit langsung ke smartphone staf beserta opsi tukar shift resmi.
4
4. Pantau & Patuhi Aturan
Presensi & batas lembur terpantau real-time sesuai PP No. 35/2021.
150+
Cabang Aktif
10K+
Jam Shift Roster
500+
Roster Terbit
24/7
Sistem Siaga
"Sebelumnya kami butuh waktu seharian untuk mencocokkan jadwal kasir dan barista. Sejak pakai Jadwalin, roster mingguan selesai 5 menit tanpa ada bentrok jam lagi!"
Rani Aditya
Manajer Operasional, Kopi Nusantara Malang

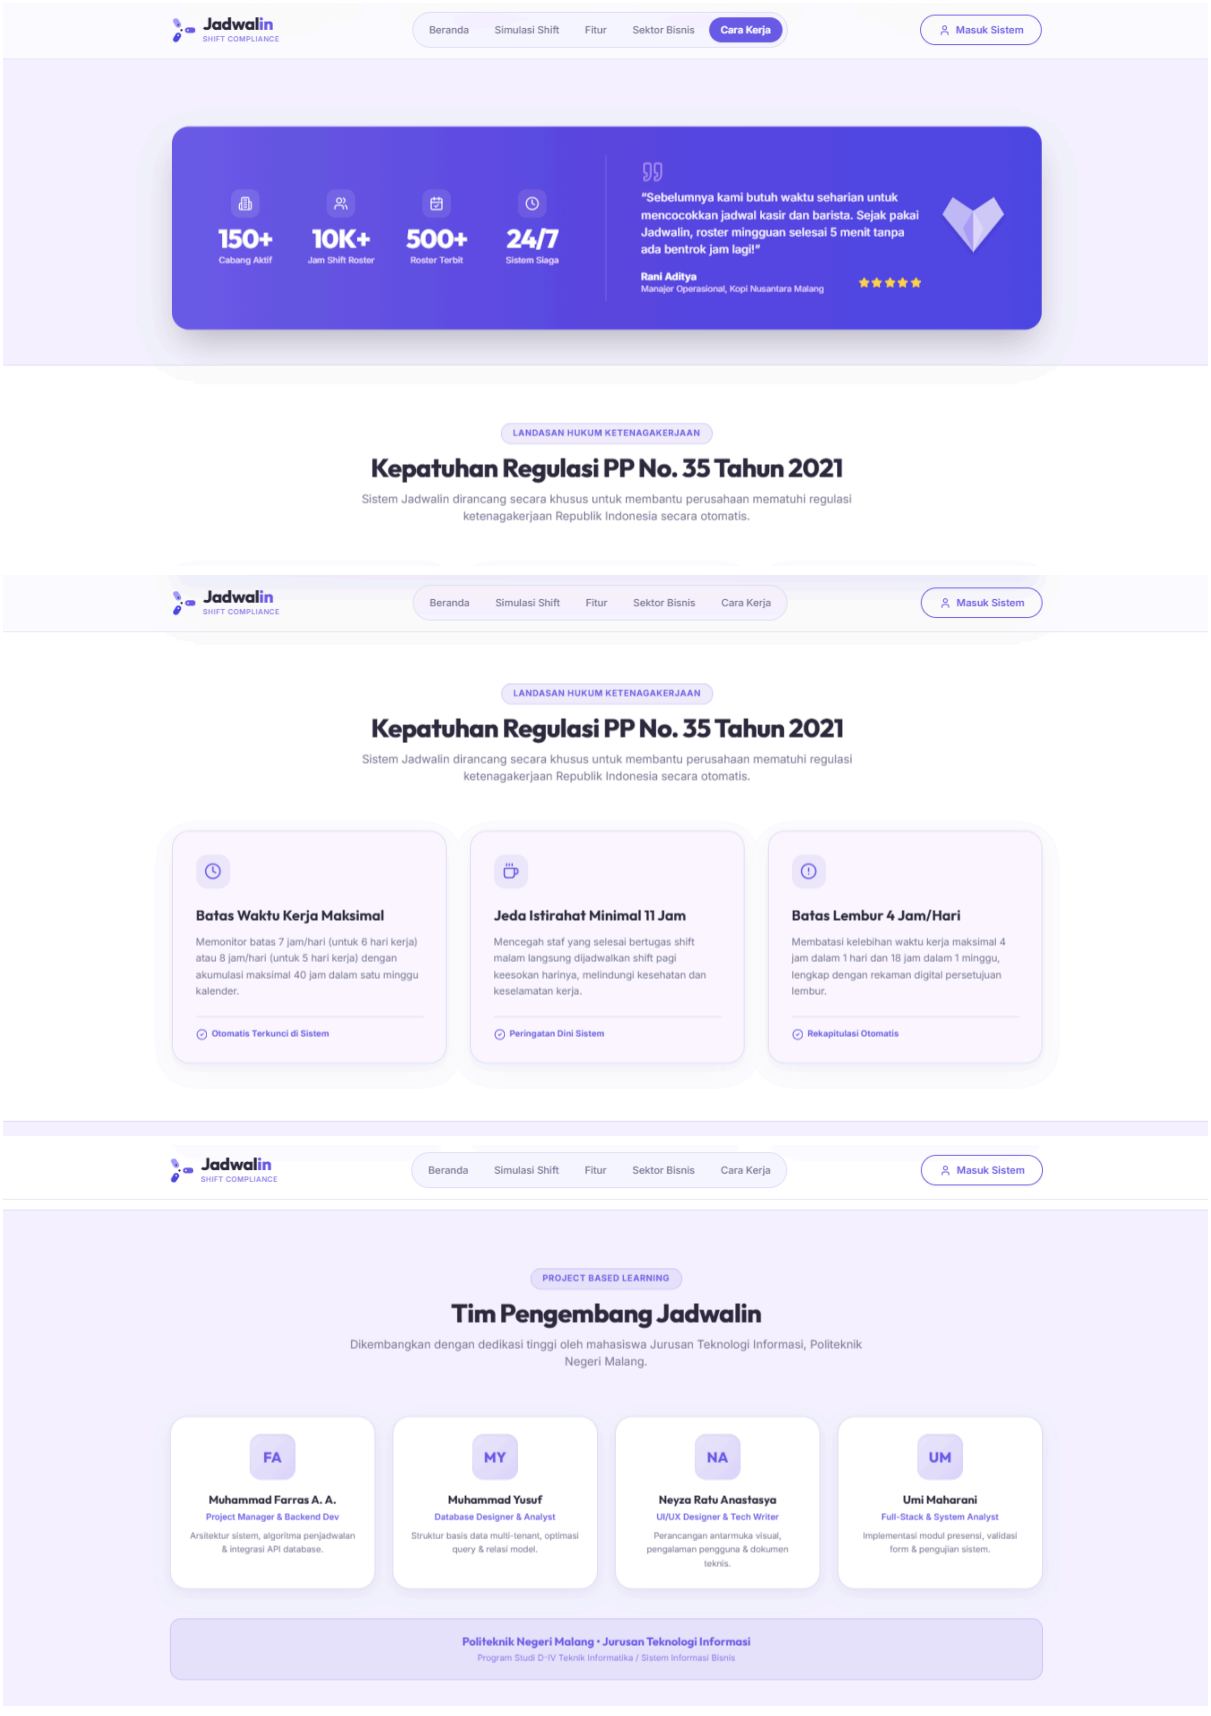

Jadwalin
SHIFT COMPLIANCE
Beranda
Simulasi Shift
Fitur
Sektor Bisnis
Cara Kerja
Masuk Sistem
150+
Cabang Aktif
10K+
Jam Shift Roster
500+
Roster Terbit
24/7
Sistem Siaga
"Sebelumnya kami butuh waktu seharian untuk mencocokkan jadwal kasir dan barista. Sejak pakai Jadwalin, roster mingguan selesai 5 menit tanpa ada bentrok jam lagi!"
Rani Aditya
Manajer Operasional, Kopi Nusantara Malang
LANDASAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
Kepatuhan Regulasi PP No. 35 Tahun 2021
Sistem Jadwalin dirancang secara khusus untuk membantu perusahaan mematuhi regulasi ketenagakerjaan Republik Indonesia secara otomatis.
Batas Waktu Kerja Maksimal
Memonitor batas 7 jam/hari (untuk 6 hari kerja) atau 8 jam/hari (untuk 5 hari kerja) dengan akumulasi maksimal 40 jam dalam satu minggu kalender.
Otomatis Terkunci di Sistem
Jeda Istirahat Minimal 11 Jam
Mencegah staf yang selesai bertugas shift malam langsung dijadwalkan shift pagi keesokan harinya, melindungi kesehatan dan keselamatan kerja.
Peringatan Dini Sistem
Batas Lembur 4 Jam/Hari
Membatasi kelebihan waktu kerja maksimal 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu, lengkap dengan rekaman digital persetujuan lembur.
Rekapitulasi Otomatis
PROJECT BASED LEARNING
Tim Pengembang Jadwalin
Dikembangkan dengan dedikasi tinggi oleh mahasiswa Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang.
FA
Muhammad Farras A. A.
Project Manager & Backend Dev
Arsitektur sistem, algoritma penjadwalan & integrasi API database.
MY
Muhammad Yusuf
Database Designer & Analyst
Struktur basis data multi-tenant, optimasi query & relasi model.
NA
Neyza Ratu Anastasya
UI/UX Designer & Tech Writer
Perancangan antarmuka visual, pengalaman pengguna & dokumen teknis.
UM
Umi Maharani
Full-Stack & System Analyst
Implementasi modul presensi, validasi form & pengujian sistem.
Politeknik Negeri Malang • Jurusan Teknologi Informasi
Program Studi D-IV Teknik Informatika / Sistem Informasi Bisnis

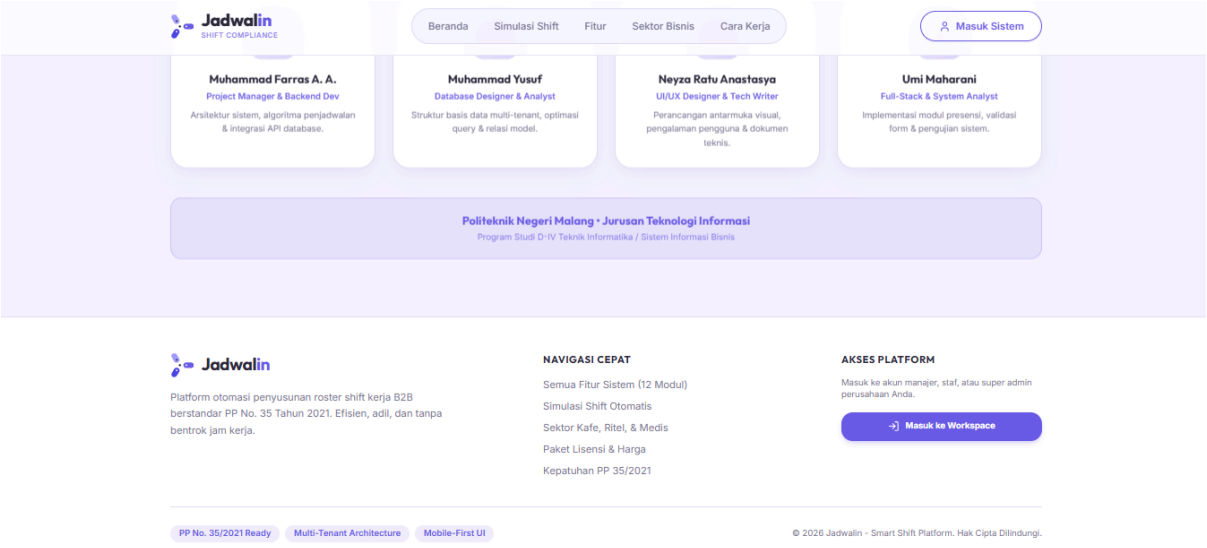


3.Simulasi Shift

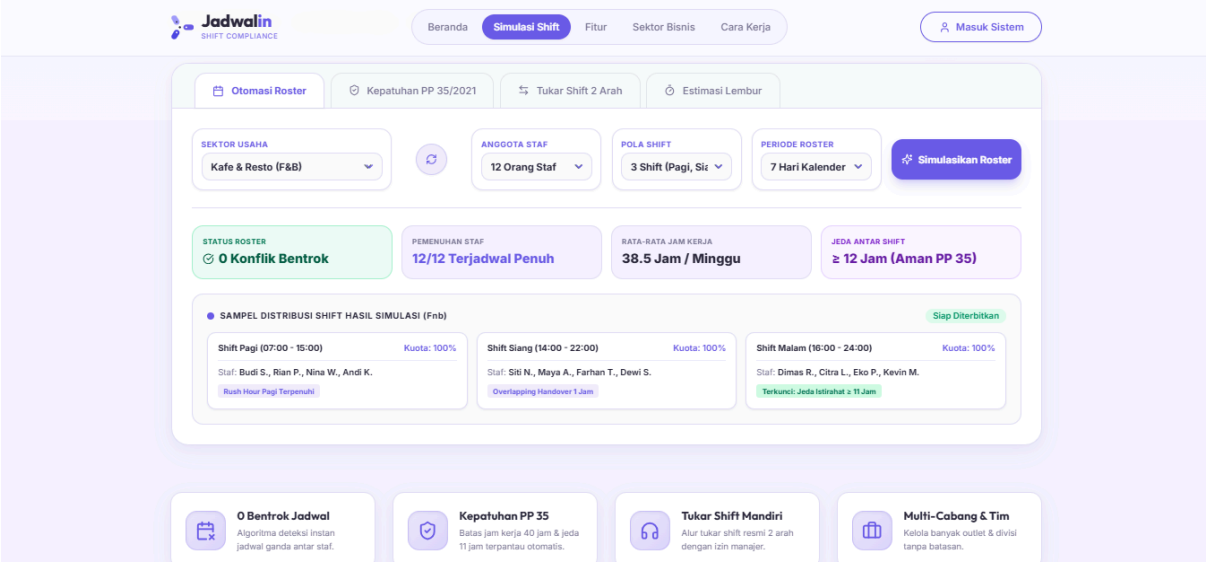

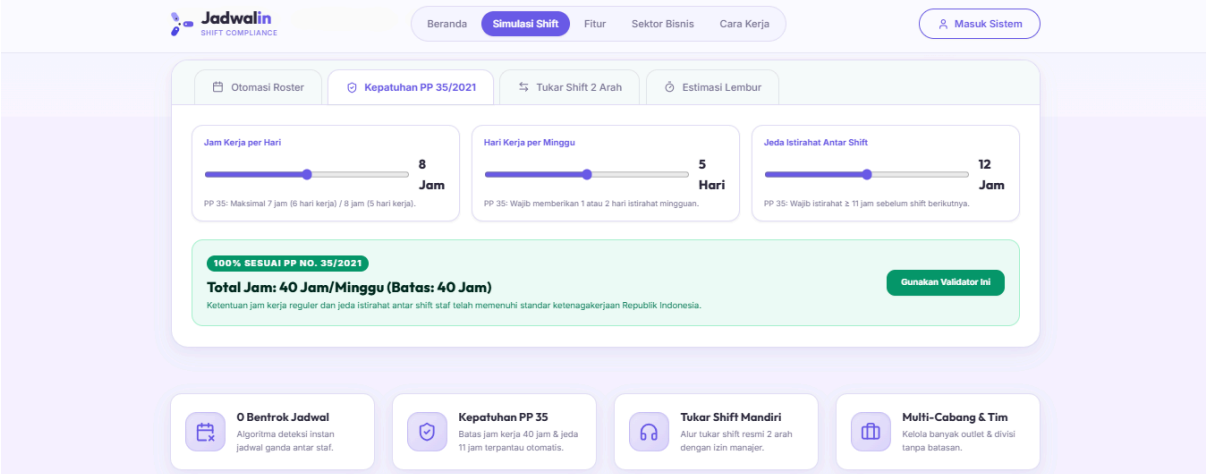


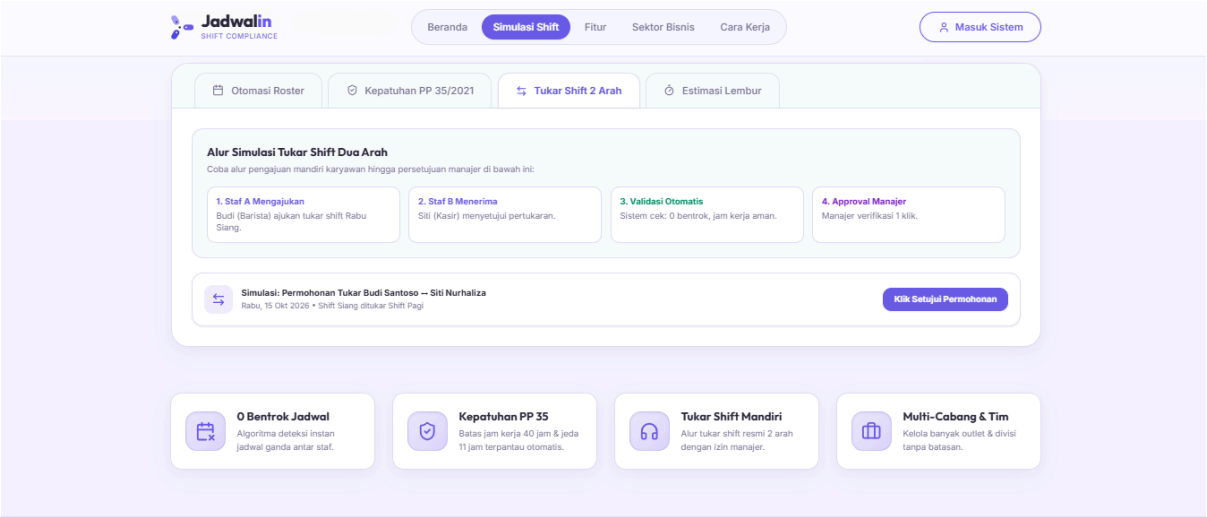
Jadwalin
SHIFT COMPLIANCE
Beranda
Simulasi Shift
Fitur
Sektor Bisnis
Cara Kerja
Masuk Sistem
Otomasi Roster
Kepatuhan PP 35/2021
Tukar Shift 2 Arah
Estimasi Lembur
Alur Simulasi Tukar Shift Dua Arah
Coba alur pengajuan mandiri karyawan hingga persetujuan manajer di bawah ini:
1. Staf A Mengajukan
Budi (Barista) ajukan tukar shift Rabu Siang.
2. Staf B Menerima
Siti (Kasir) menyetujui pertukaran.
3. Validasi Otomatis
Sistem cek: 0 bentrok, jam kerja aman.
4. Approval Manajer
Manajer verifikasi 1 klik.
Simulasi: Permohonan Tukar Budi Santoso ↔ Siti Nurhaliza
Rabu, 15 Okt 2026 • Shift Siang ditukar Shift Pagi
Klik Setujui Permohonan
0 Bentrok Jadwal
Algoritma deteksi instan jadwal ganda antar staf.
Kepatuhan PP 35
Batas jam kerja 40 jam & jeda 11 jam terpantau otomatis.
Tukar Shift Mandiri
Alur tukar shift resmi 2 arah dengan izin manajer.
Multi-Cabang & Tim
Kelola banyak outlet & divisi tanpa batasan.

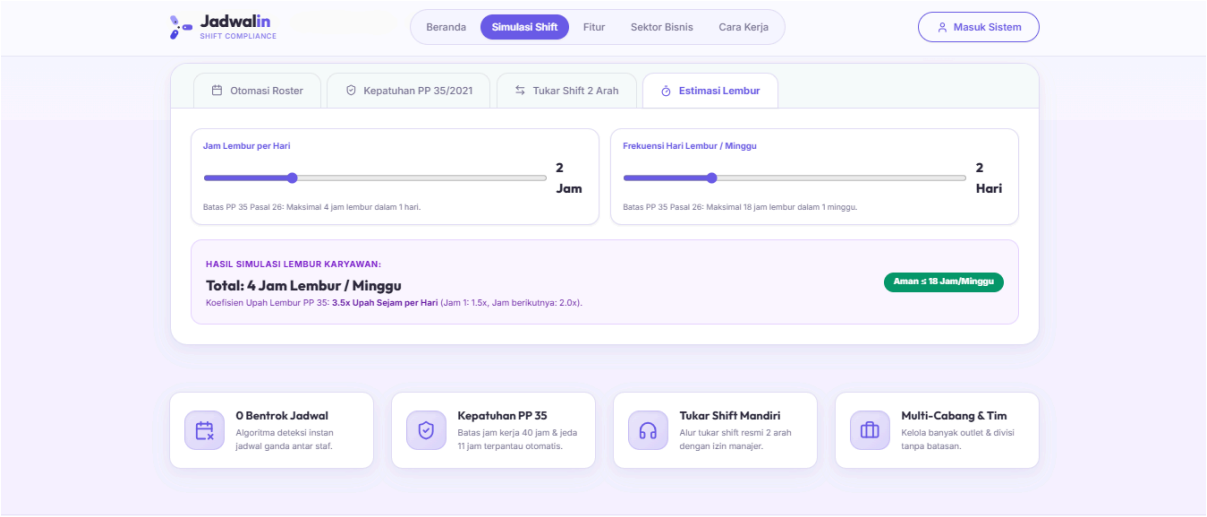

Jadwalin
SHIFT COMPLIANCE
Beranda
Simulasi Shift
Fitur
Sektor Bisnis
Cara Kerja
Masuk Sistem
Otomasi Roster
Kepatuhan PP 35/2021
Tukar Shift 2 Arah
Estimasi Lembur
Jam Lembur per Hari
2 Jam
Batas PP 35 Pasal 26: Maksimal 4 jam lembur dalam 1 hari.
Frekuensi Hari Lembur / Minggu
2 Hari
Batas PP 35 Pasal 26: Maksimal 18 jam lembur dalam 1 minggu.
HASIL SIMULASI LEMBUR KARYAWAN:
Total: 4 Jam Lembur / Minggu
Koefisien Upah Lembur PP 35: 3.5x Upah Sejam per Hari (Jam 1: 1.5x, Jam berikutnya: 2.0x).
Aman ≤ 18 Jam/Minggu
0 Bentrok Jadwal
Algoritma deteksi instan jadwal ganda antar staf.
Kepatuhan PP 35
Batas jam kerja 40 jam & jeda 11 jam terpantau otomatis.
Tukar Shift Mandiri
Alur tukar shift resmi 2 arah dengan izin manajer.
Multi-Cabang & Tim
Kelola banyak outlet & divisi tanpa batasan.

4.Fitur



Jadwalin
SHIFT COMPLIANCE
Beranda
Simulasi Shift
Fitur
Sektor Bisnis
Cara Kerja
Masuk Sistem
EKOSISTEM LENGKAP PLATFORM
SEMUA FITUR JADWALIN
Otomatis. Adil. Terlindungi Hukum.
Kumpulan fitur terpadu untuk mengelola operasional kerja shift: dari penyusunan roster tim, validasi hukum PP No. 35/2021, presensi digital mandiri, hingga laporan timesheet kerja.
Semua Fitur (12)
Penjadwalan Roster
Kepatuhan PP 35
Tukar & Open Shift
Presensi & Timesheet
Struktur & RBAC
PENJADWALAN ROSTER
Role: Manager / Admin
Smart Roster & Auto-Scheduling
Algoritma cerdas yang menyusun roster kerja mingguan tanpa risiko bentrok. Menghitung kuota staf, kompetensi divisi, dan preferensi waktu secara presisi.
Deteksi bentrok jadwal ganda secara instan
Auto-fill kuota posisi (kasir, barista, perawat)
Tampilan grid kalender mingguan & bulanan
PENJADWALAN ROSTER
Role: Super Admin / Mgr
Master Template Shift Fleksibel
Konfigurasi template jam kerja: pola 2-shift, 3-shift nonstop 24/7, hingga Split Shift jam sibuk (rush hour resto). Lengkap dengan batas durasi dan toleransi terlambat.
Mendukung Split Shift (siang & malam)
Preset toleransi keterlambatan menit kerja
Rotasi otomatis shift bergilir mingguan
KEPATUHAN PP 35
Semua Peran (Legal RI)
Kepatuhan Jam Kerja PP 35/2021
Mencegah pelanggaran Pasal 21 PP No. 35 Tahun 2021. Menjaga batas 7 jam/hari (6 hari kerja) atau 8 jam/hari (5 hari kerja) dengan akumulasi maksimal 40 jam per minggu.
Kunci otomatis akumulasi maks 40 jam/minggu
Peringatan dini visual sebelum jam berlebih
Jaminan kepatuhan audit Disnaker & Kemenaker

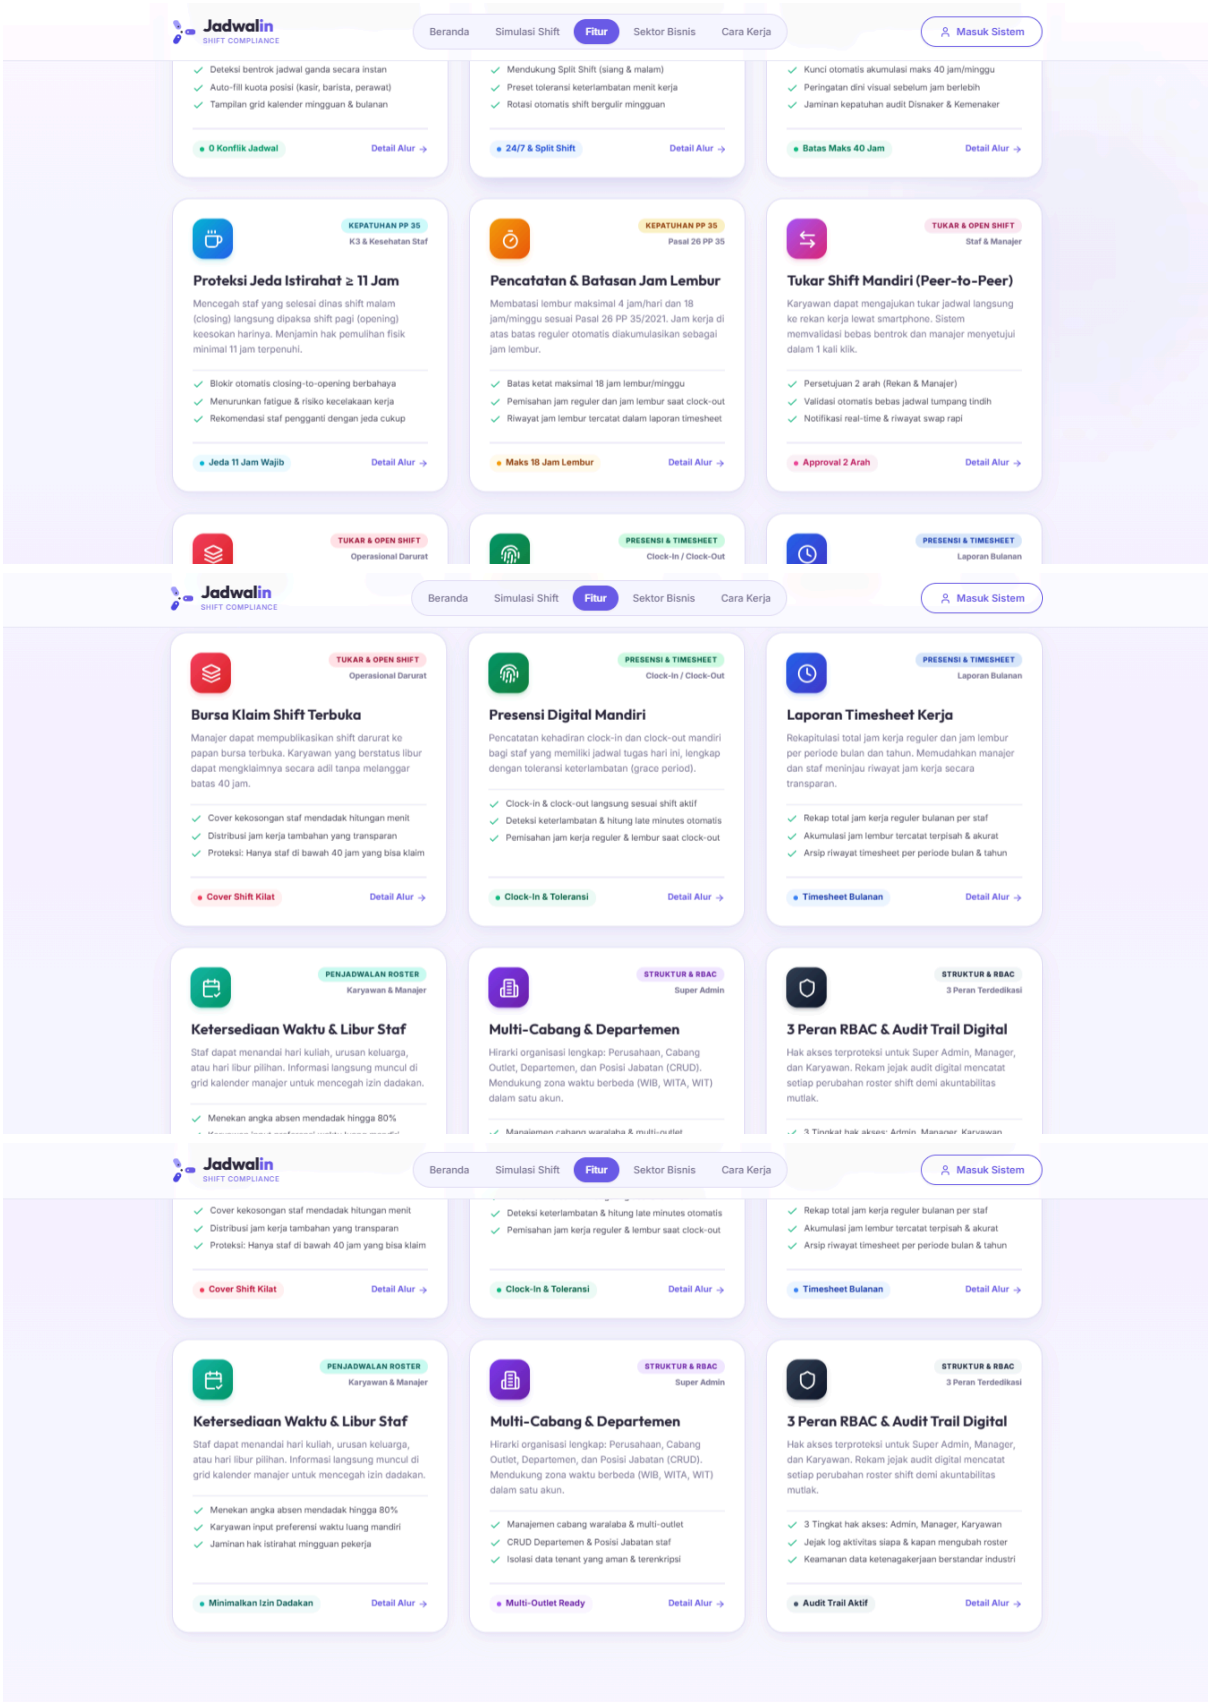


5.Sektor Bisnis

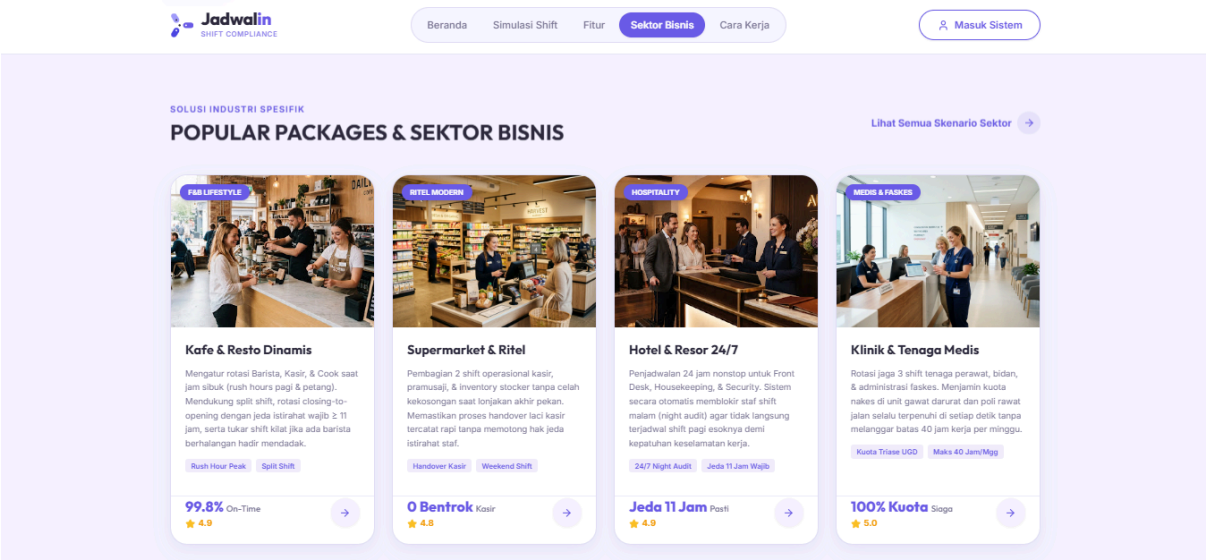


6.Cara Kerja

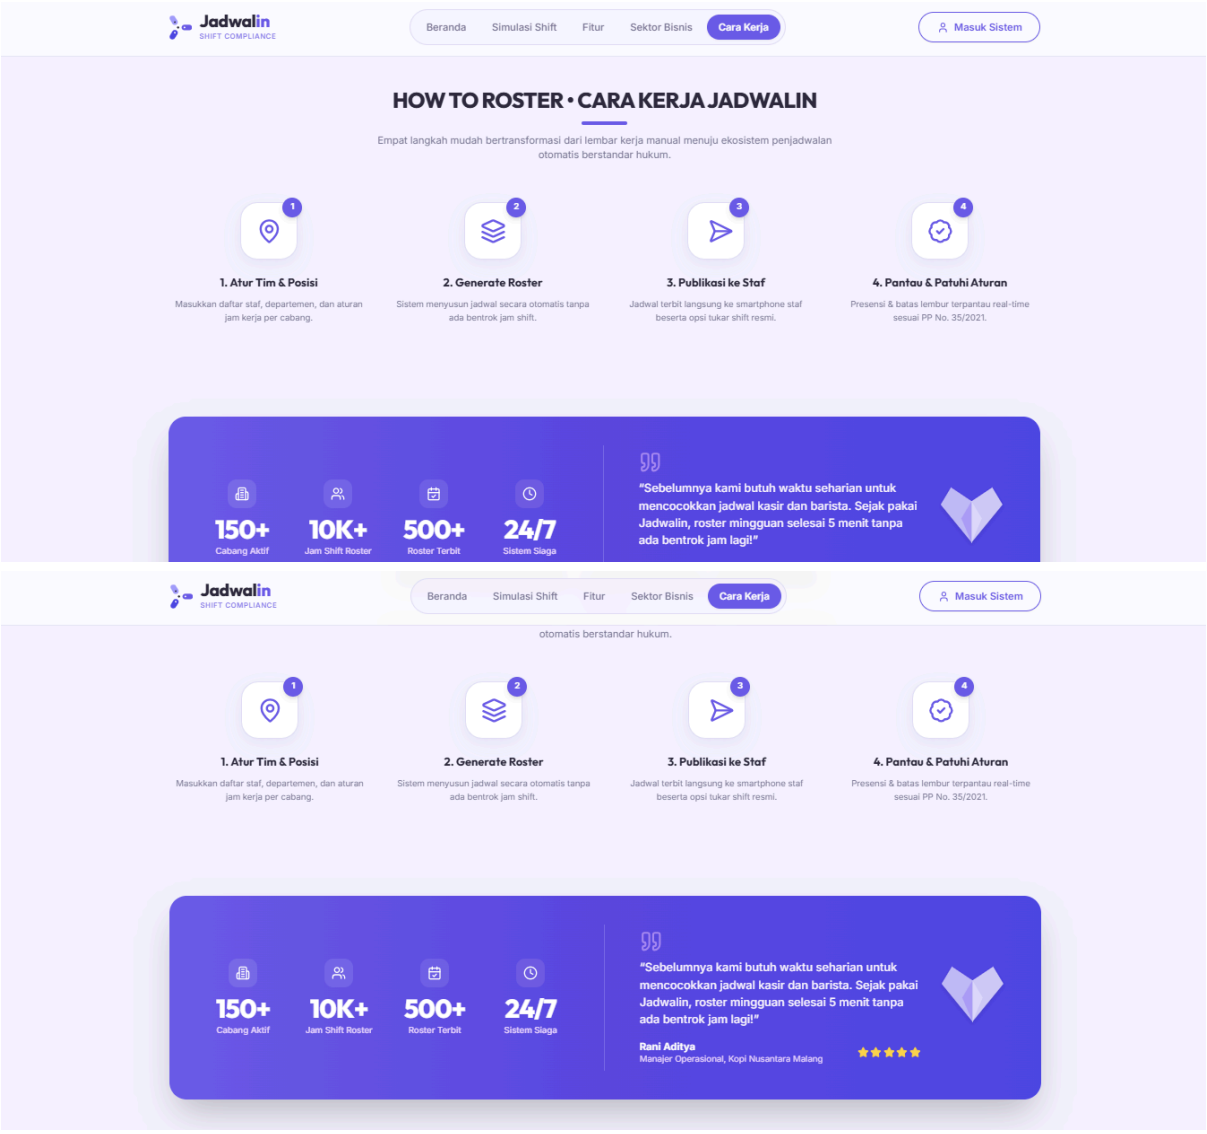


7.Dashboard Karyawan

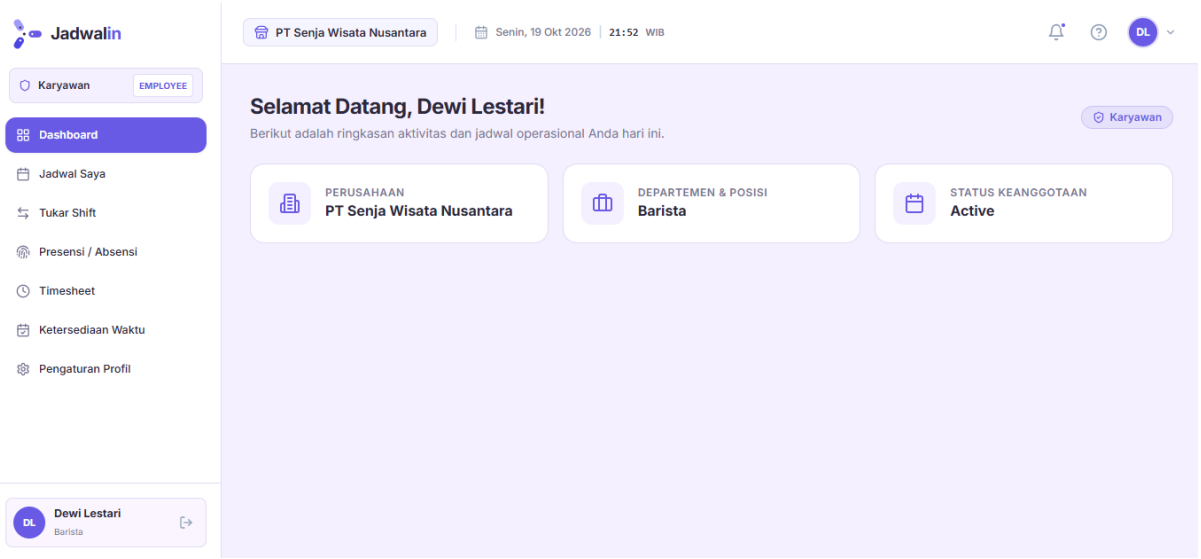


8.Dashboard Karyawan | Presensi / Absensi

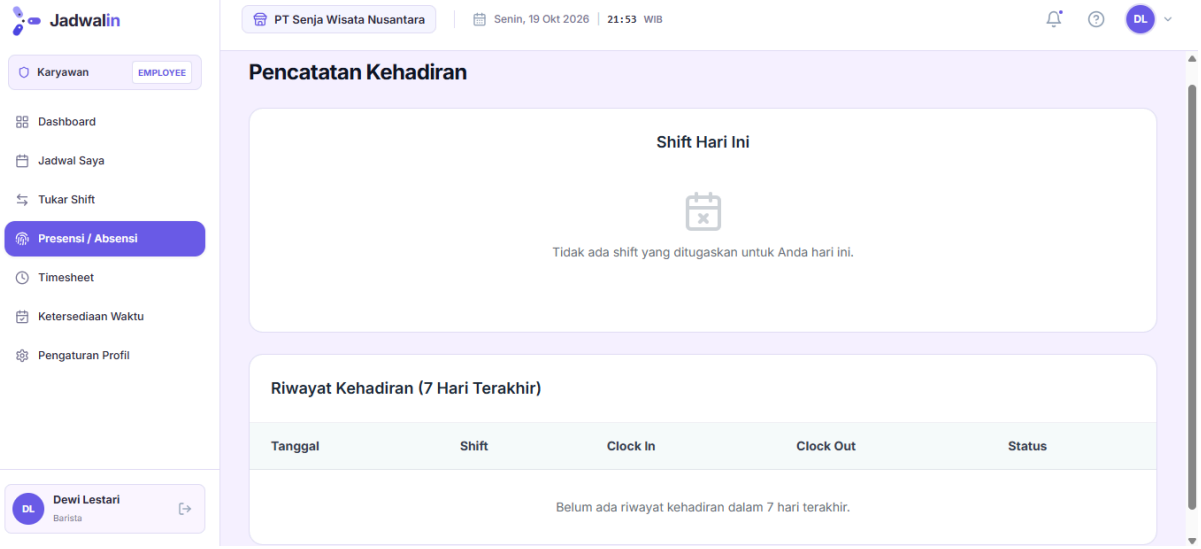


9.Dashboard Karyawan | Ketersediaan Waktu

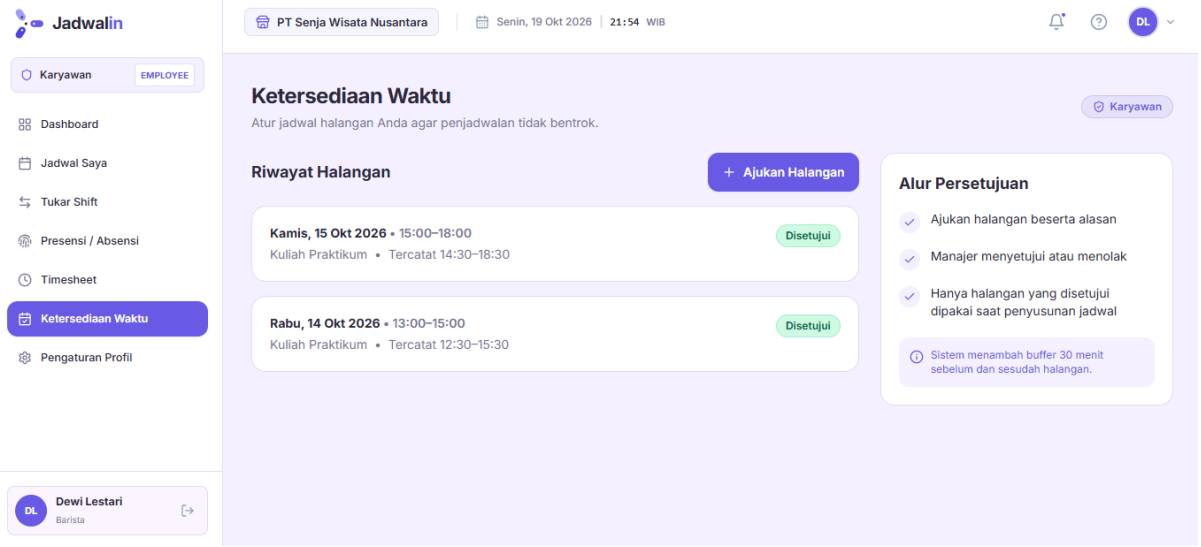


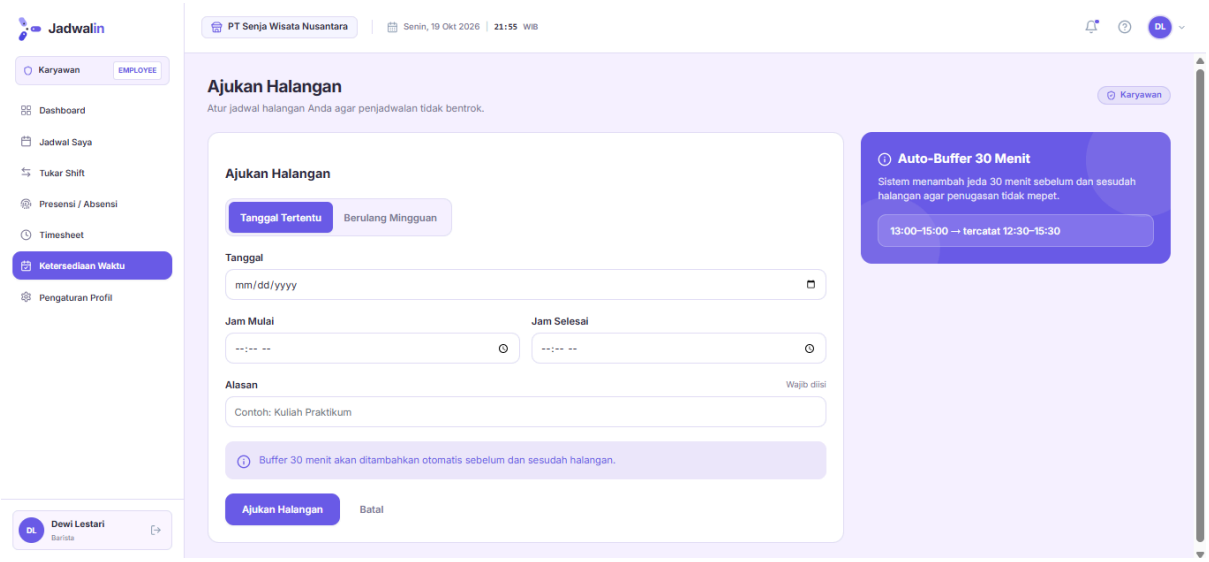


10.Dashboard Karyawan | Pengaturan Profil

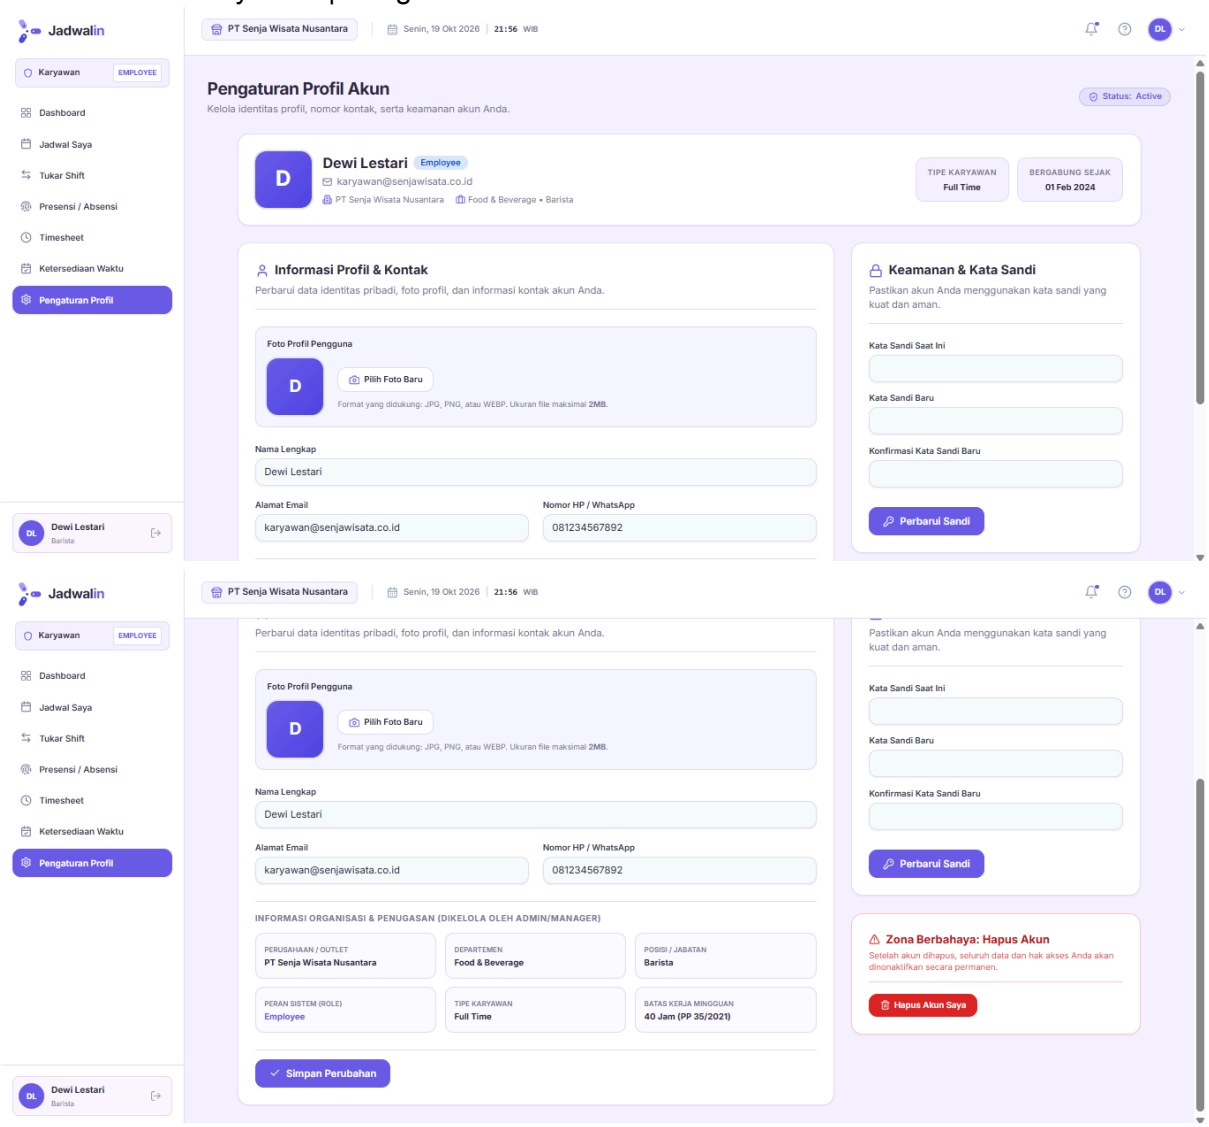


11.Dashboard Manager

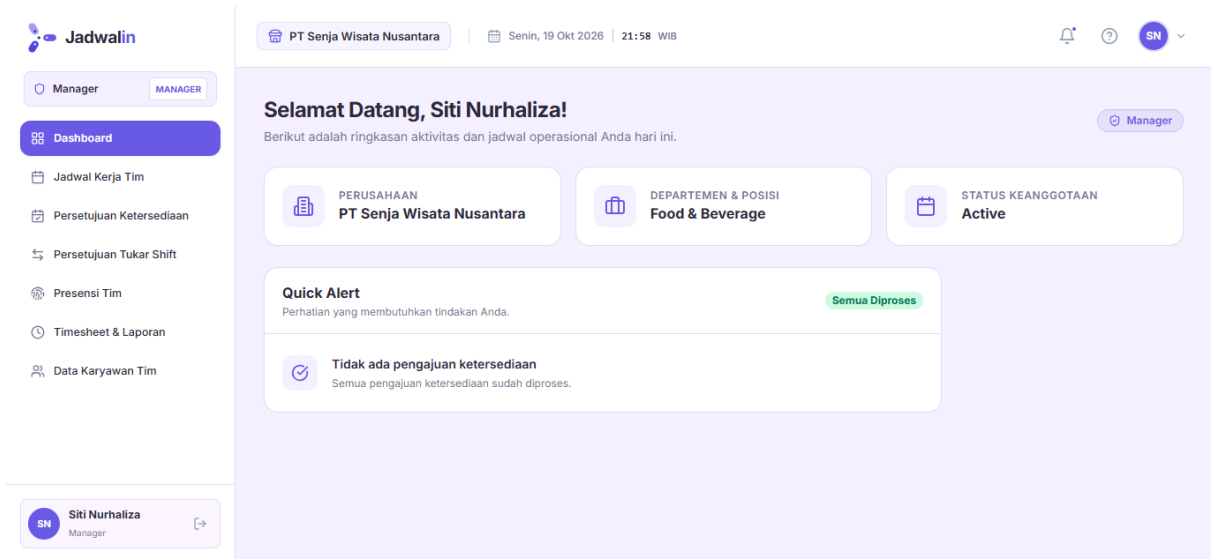



12.Dashboard Manager | Jadwal Kerja Tim

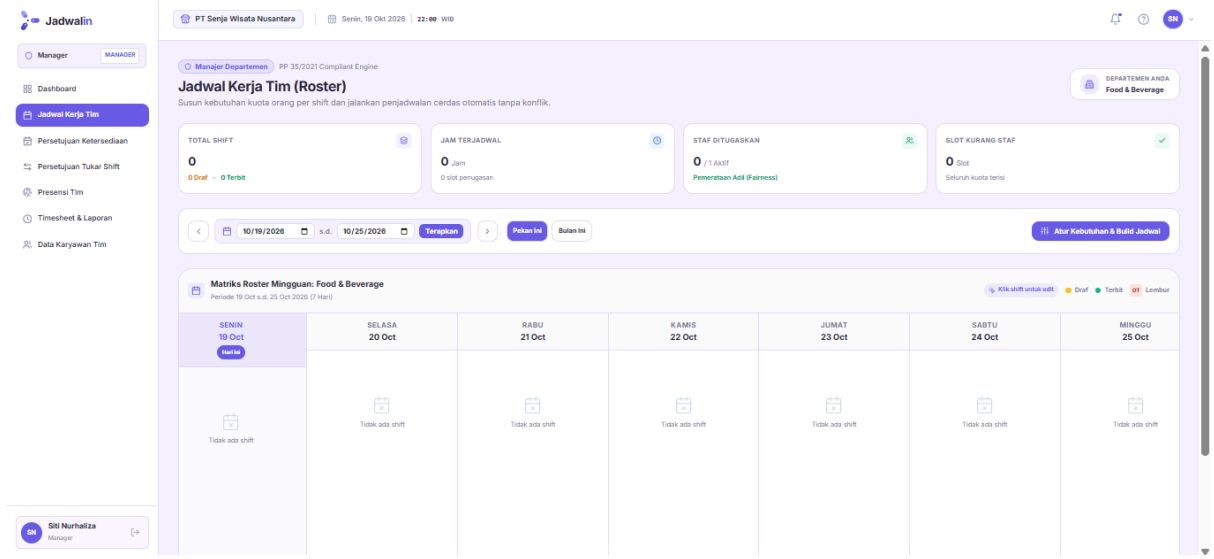


13.Dashboard Manager | Persetujuan Ketersediaan

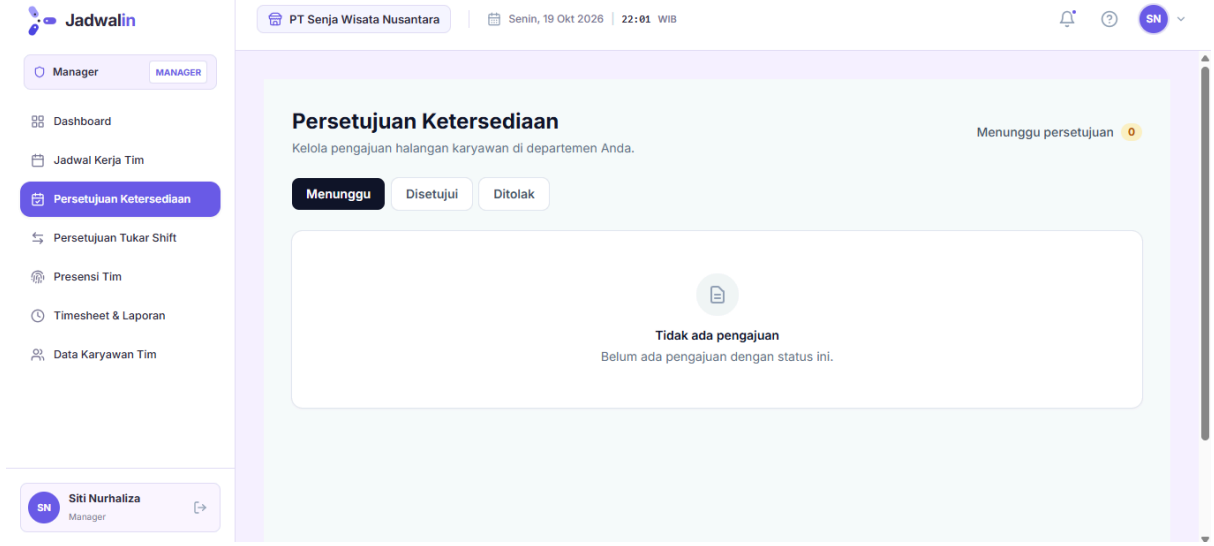


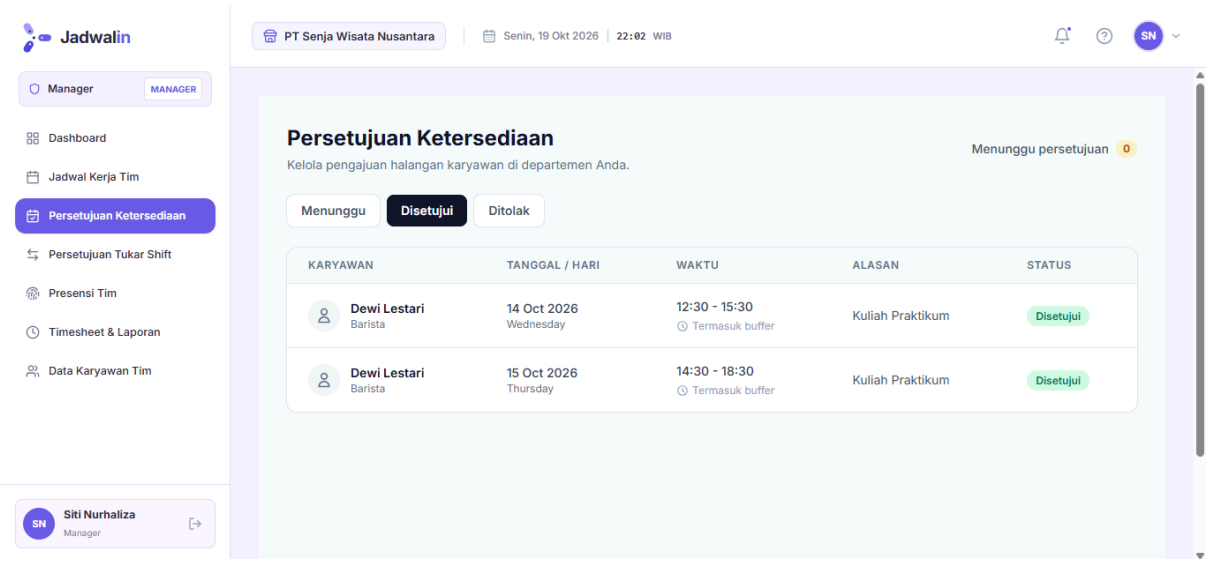

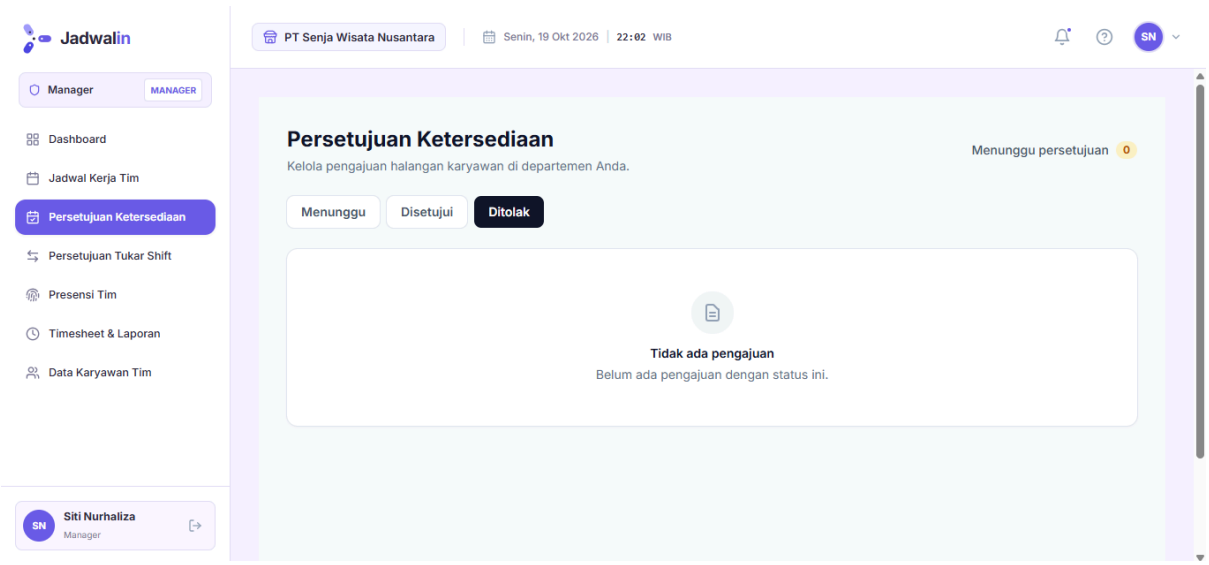


14.Dashboard Manager | Edit Profil (pengaturan profil)

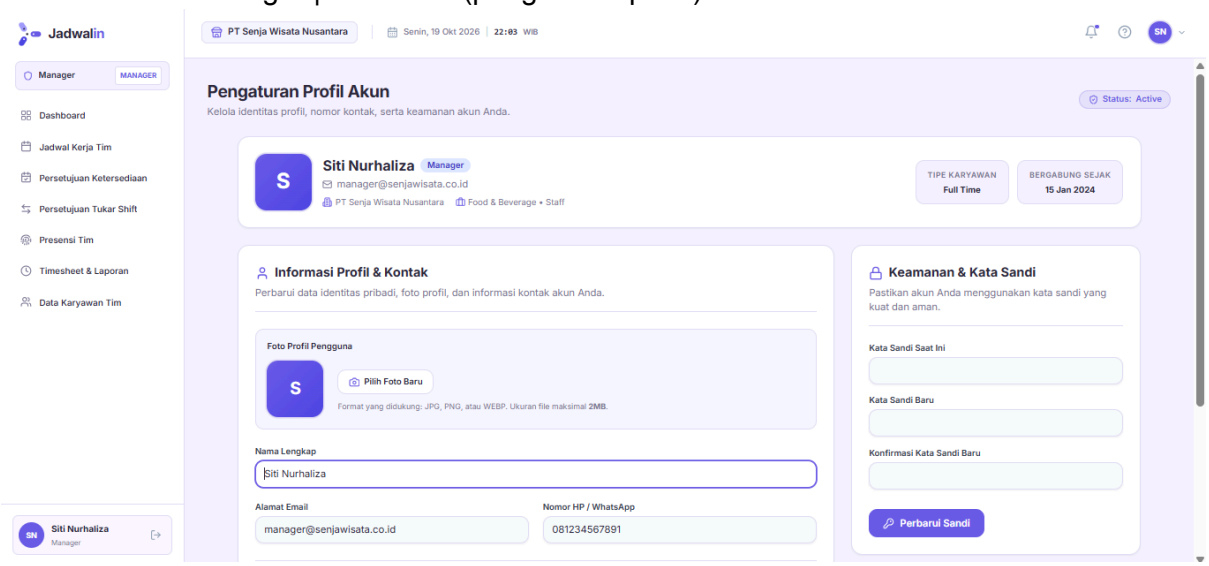


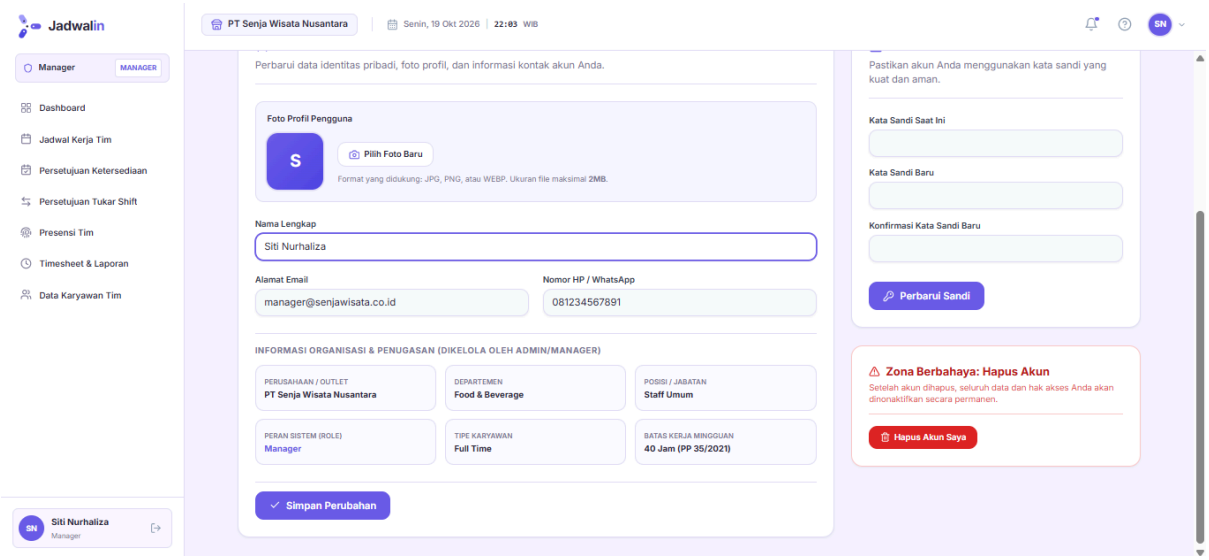



15.Dashboard SuperAdmin

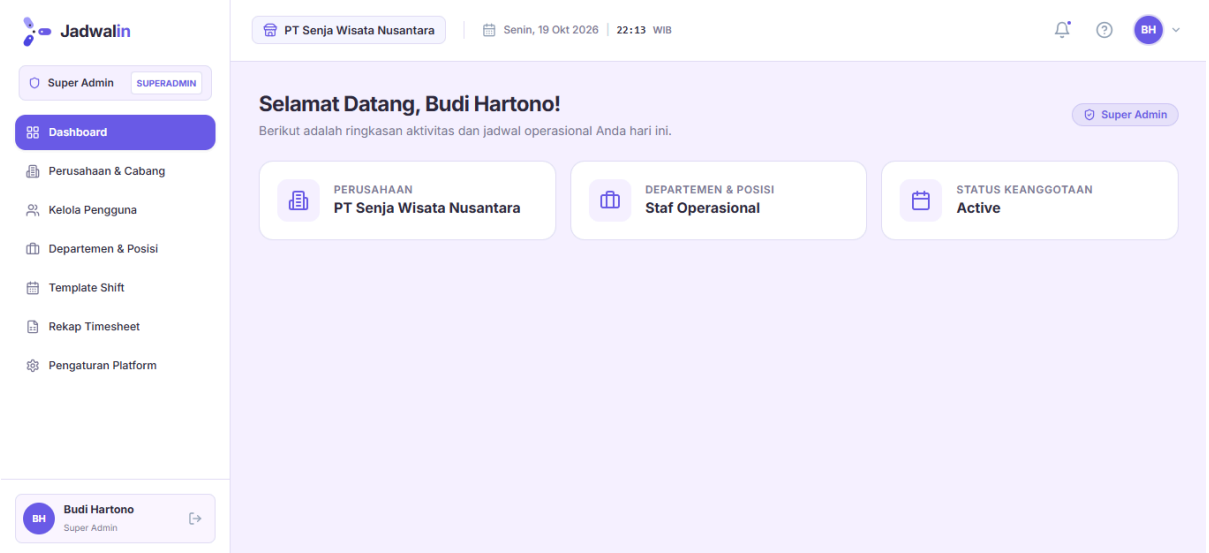



16.Dashboard SuperAdmin | Departemen & Posisi

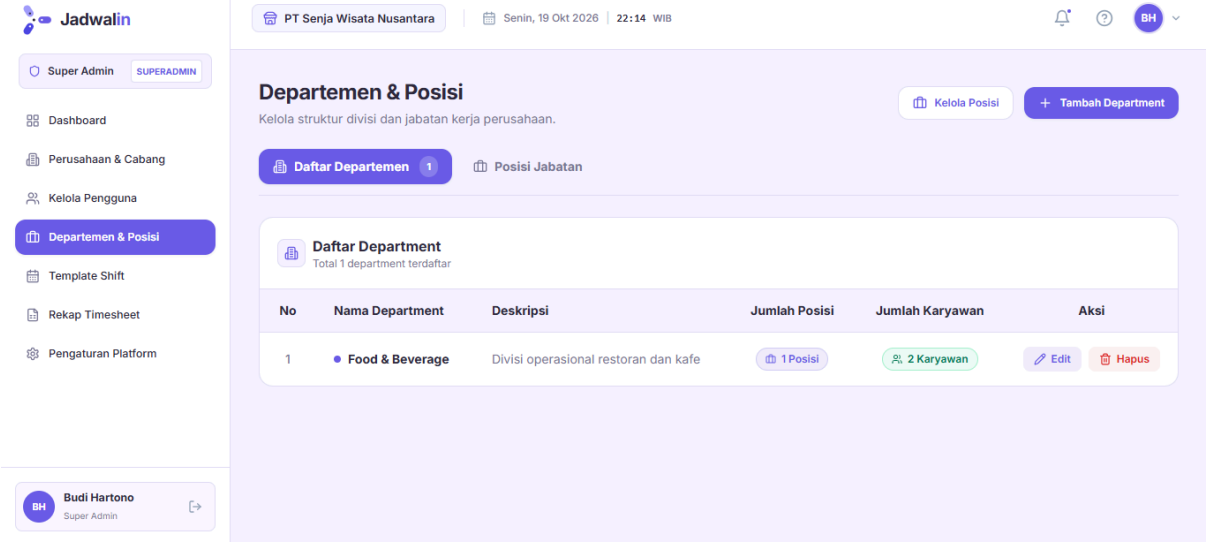

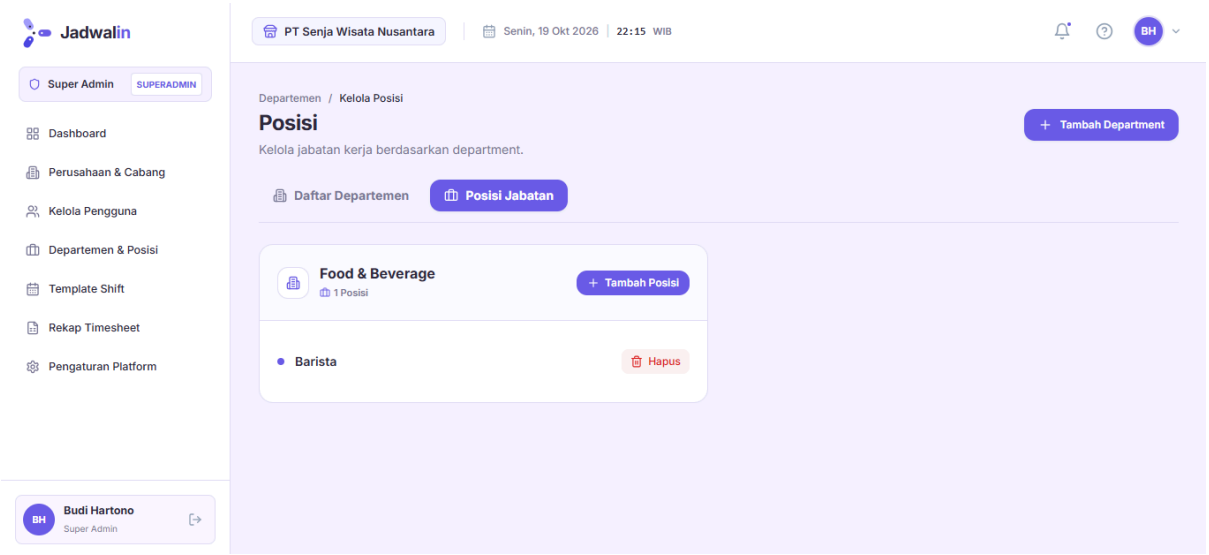

Jadwalin
PT Senja Wisata Nusantara
Senin, 19 Okt 2026 | 22:15 WIB
BH
Super Admin
SUPERADMIN
Dashboard
Perusahaan & Cabang
Kelola Pengguna
Departemen & Posisi
Template Shift
Rekap Timesheet
Pengaturan Platform
Departemen / Kelola Posisi
Posisi
Kelola jabatan kerja berdasarkan department.
Tambah Department
Daftar Departemen
Posisi Jabatan
Food & Beverage
1 Posisi
Tambah Posisi
Barista
Hapus
Budi Hartono
Super Admin

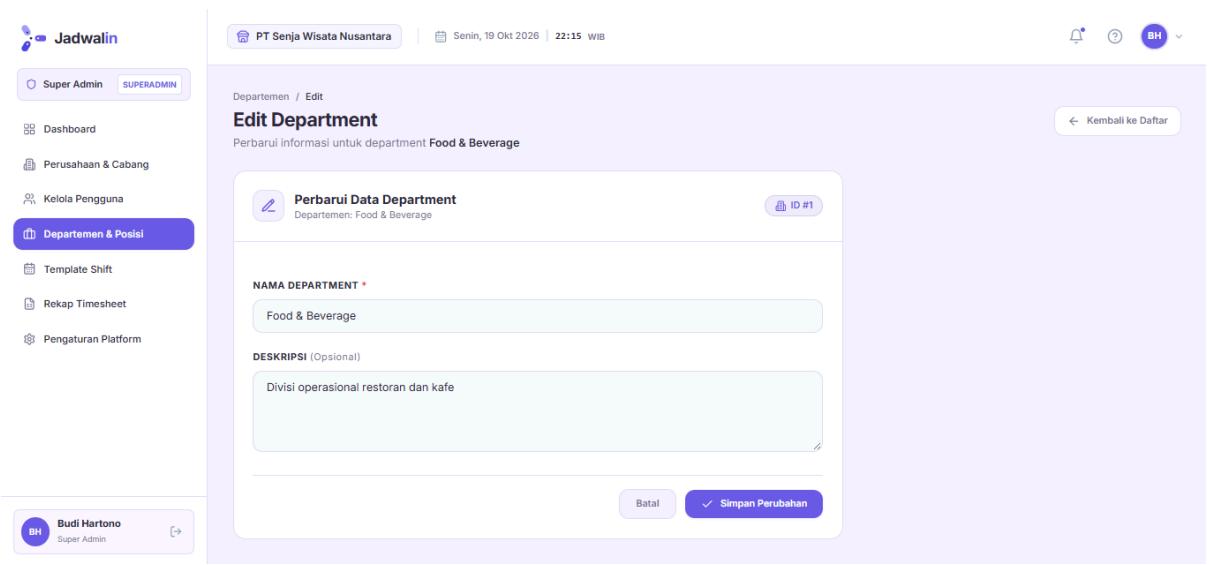

Jadwalin
PT Senja Wisata Nusantara
Senin, 19 Okt 2026 | 22:15 WIB
BH
Super Admin
SUPERADMIN
Dashboard
Perusahaan & Cabang
Kelola Pengguna
Departemen & Posisi
Template Shift
Rekap Timesheet
Pengaturan Platform
Departemen / Edit
Edit Department
Perbarui informasi untuk department Food & Beverage
Kembali ke Daftar
Perbarui Data Department
Departemen: Food & Beverage
ID #1
NAMA DEPARTMENT *
Food & Beverage
DESKRIPSI (Opsional)
Divisi operasional restoran dan kafe
Batal
Simpan Perubahan
Budi Hartono
Super Admin

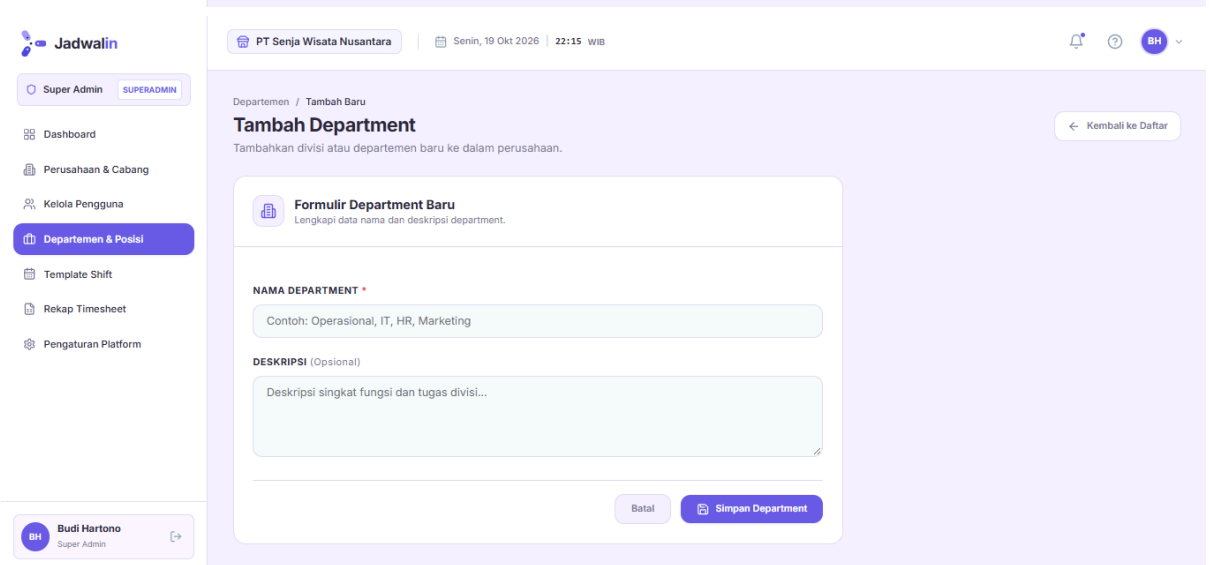

Jadwalin
PT Senja Wisata Nusantara
Senin, 19 Okt 2026 | 22:15 WIB
BH
Super Admin
SUPERADMIN
Dashboard
Perusahaan & Cabang
Kelola Pengguna
Departemen & Posisi
Template Shift
Rekap Timesheet
Pengaturan Platform
Departemen / Tambah Baru
Tambah Department
Tambahkan divisi atau departemen baru ke dalam perusahaan.
Kembali ke Daftar
Formulir Department Baru
Lengkapi data nama dan deskripsi department.
NAMA DEPARTMENT *
Contoh: Operasional, IT, HR, Marketing
DESKRIPSI (Opsional)
Deskripsi singkat fungsi dan tugas divisi...
Batal
Simpan Department
Budi Hartono
Super Admin

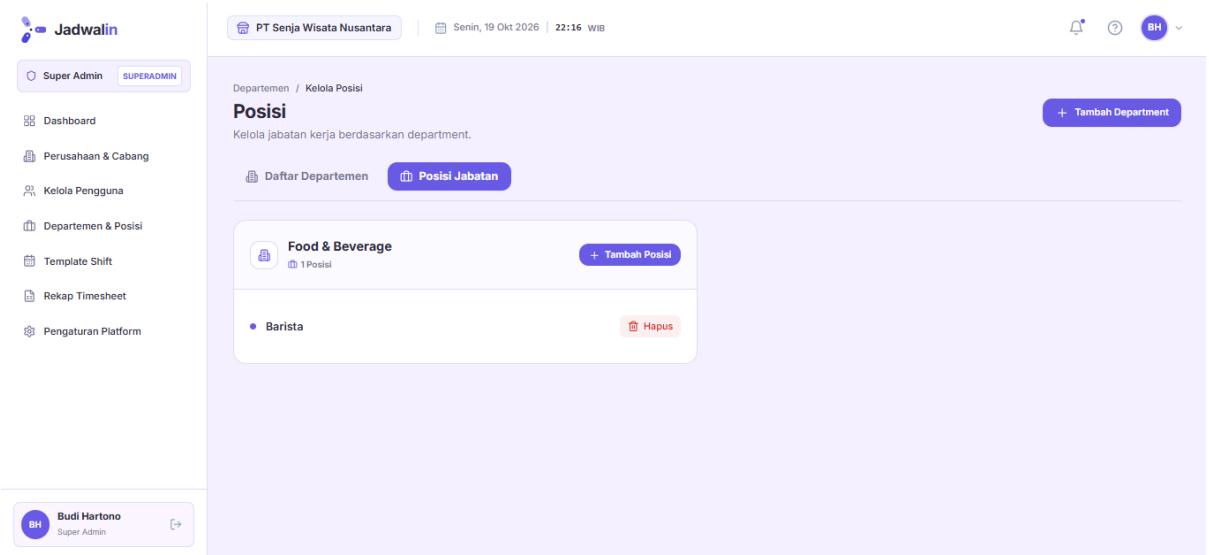


17.Dashboard SuperAdmin | Template Shift

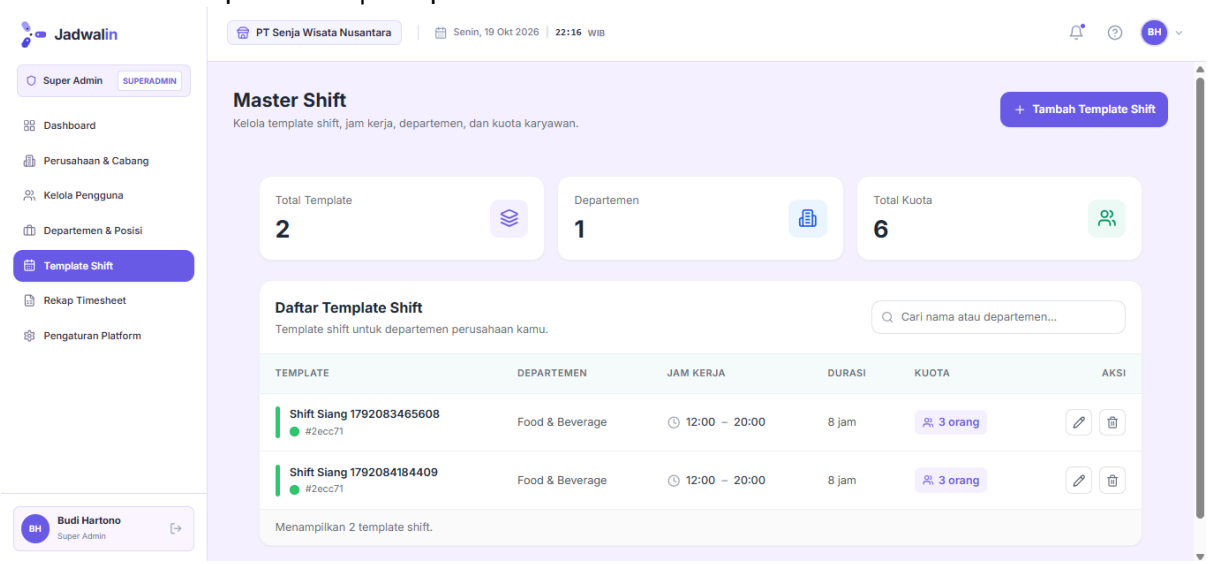

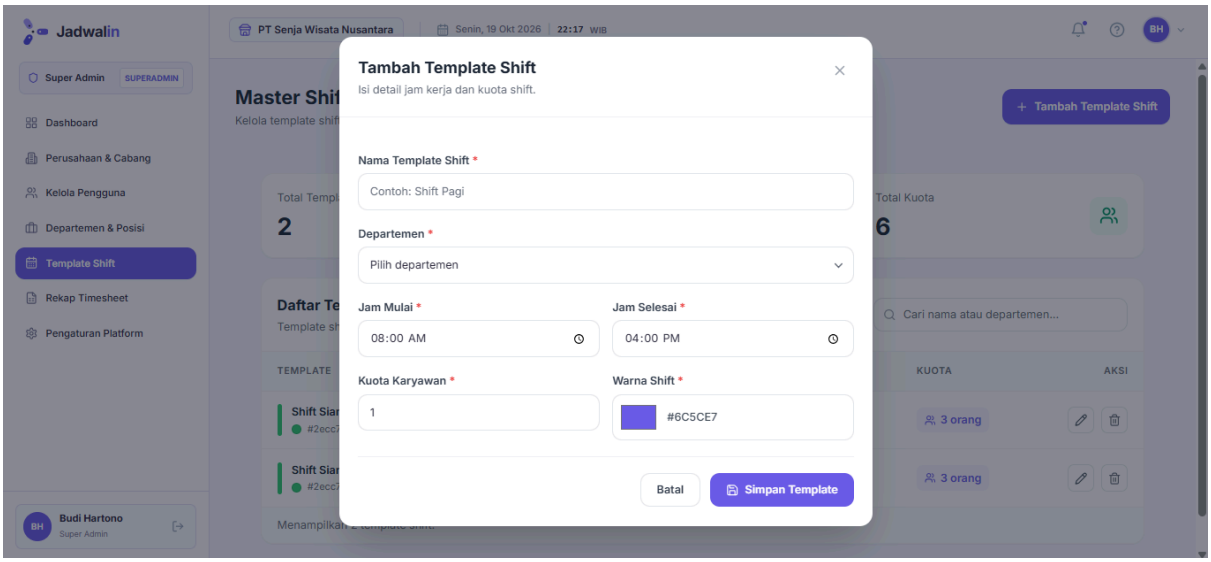


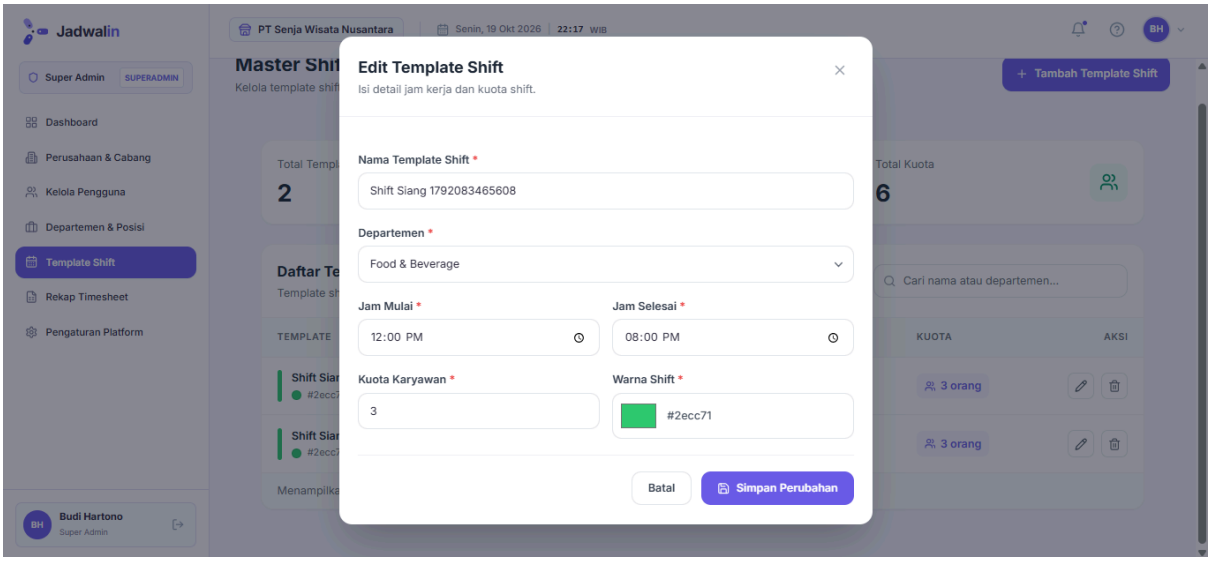

18.Dashboard SuperAdmin | Rekap Timesheet

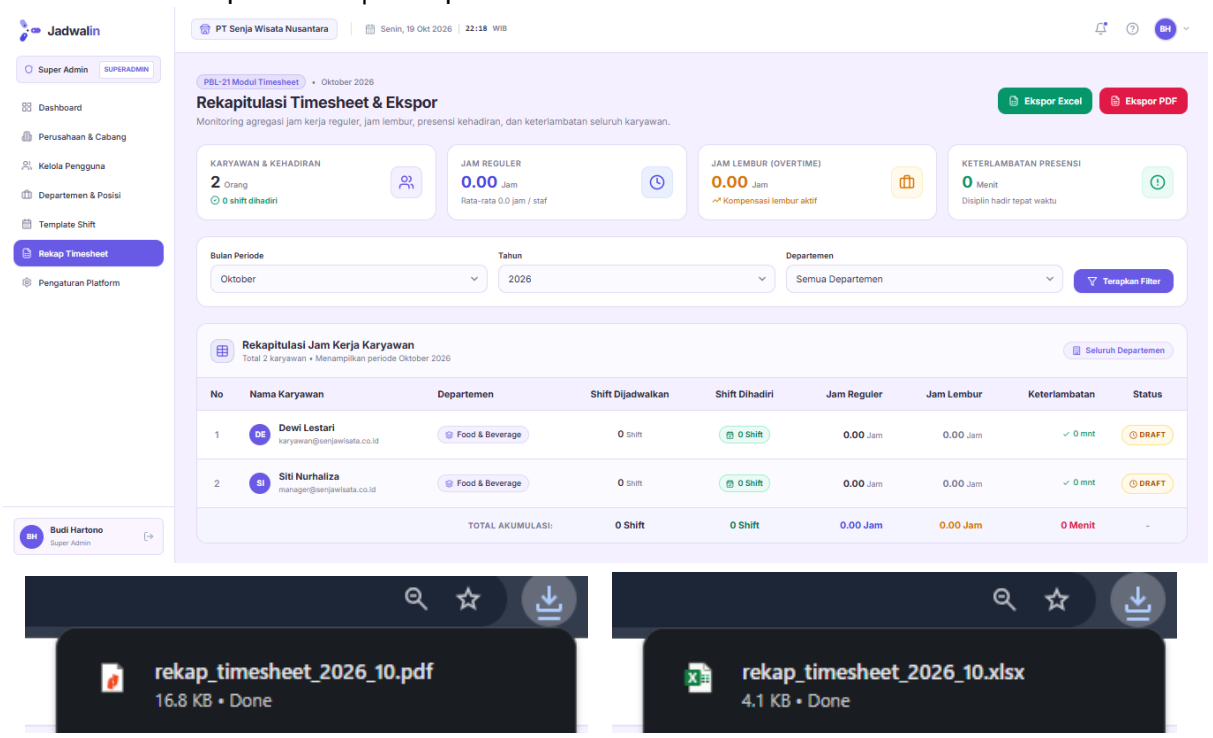

19.Dashboard SuperAdmin | Edit Profil (pengaturan profil)

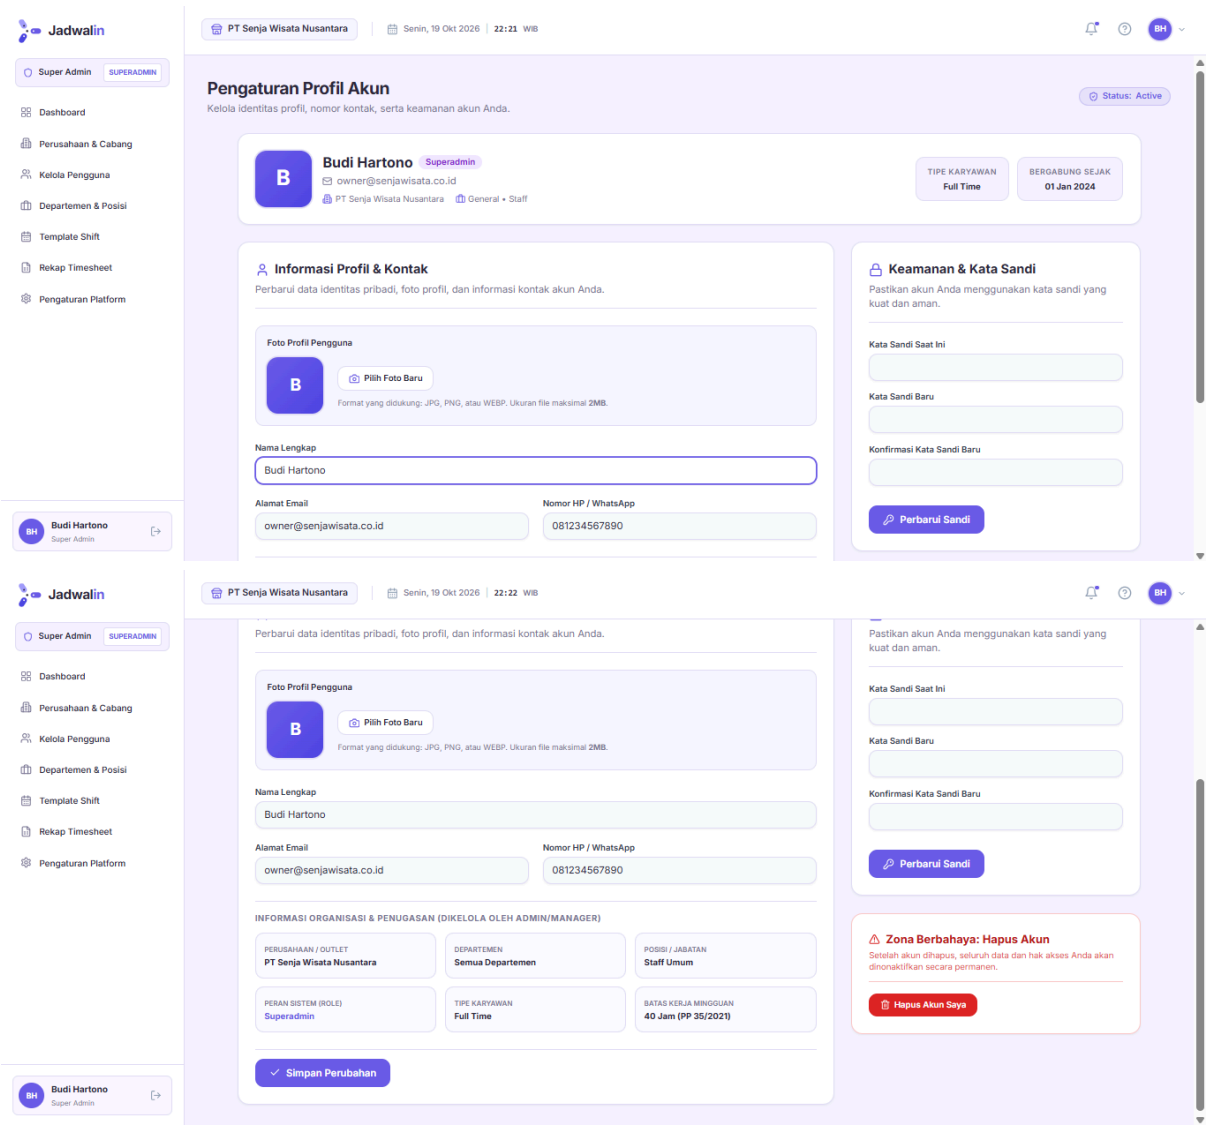

Sisipkan tangkapan layar fitur yang berjalan beserta keterangan singkat tiap gambar.

[Sisipkan gambar.]

Lampiran B. Logbook Lengkap Minggu 1–8

Sisipkan logbook mingguan lengkap.

[Sisipkan logbook.]

Lampiran C. Dokumen Pendukung (Opsional)

Misalnya catatan konsultasi dengan dosen atau mitra. Hapus lampiran ini bila tidak ada.

[Isi atau sisipkan dokumen.]

Lampiran D. Dokumen Tambahan Mata Kuliah

Gunakan halaman pemisah per mata kuliah, mis. "Lampiran D.1: Manajemen Proyek". Lampirkan LTS dan dokumen lain yang diwajibkan, atau rujuk melalui tautan tertanam. Hapus bila tidak ada.

Lampiran D.1: [Nama Mata Kuliah]

[Sisipkan dokumen atau tautan.]

Lampiran D.2: [Nama Mata Kuliah]

[Sisipkan dokumen atau tautan.]

Lampiran E. Daftar Tautan Eksternal

Setiap tautan harus dapat diklik, terbuka tanpa login, sudah diuji di jendela penyamaran, dan isinya tidak diubah setelah batas pengumpulan.

No	Keterangan	Bagian/Mata Kuliah	Tautan	Jenis Akses
